

**Departamento Municipal de Saneamento Urbano do
Município de Muriaé - DEMSUR**



**PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
– PMI-DEMSUR-001/2018**

*Procedimento de Manifestação de Interesse
para a obtenção de estudos, levantamentos e
propostas para estruturação de modelo de
concessão de serviços públicos visando a
coleta, o tratamento e a disposição final de
resíduos sólidos do município de Muriaé.*


**APÊNDICE VII – Plano de Encerramento
e Recuperação do Aterro Controlado –
Anexo do Memorial Geral – parte 1**



LEGENDA

-  AFLORAMENTO ROCHOSO
-  MATA
-  ESTRADA
-  CERCA
-  ÁRVORE

ALAMEDA - IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:500

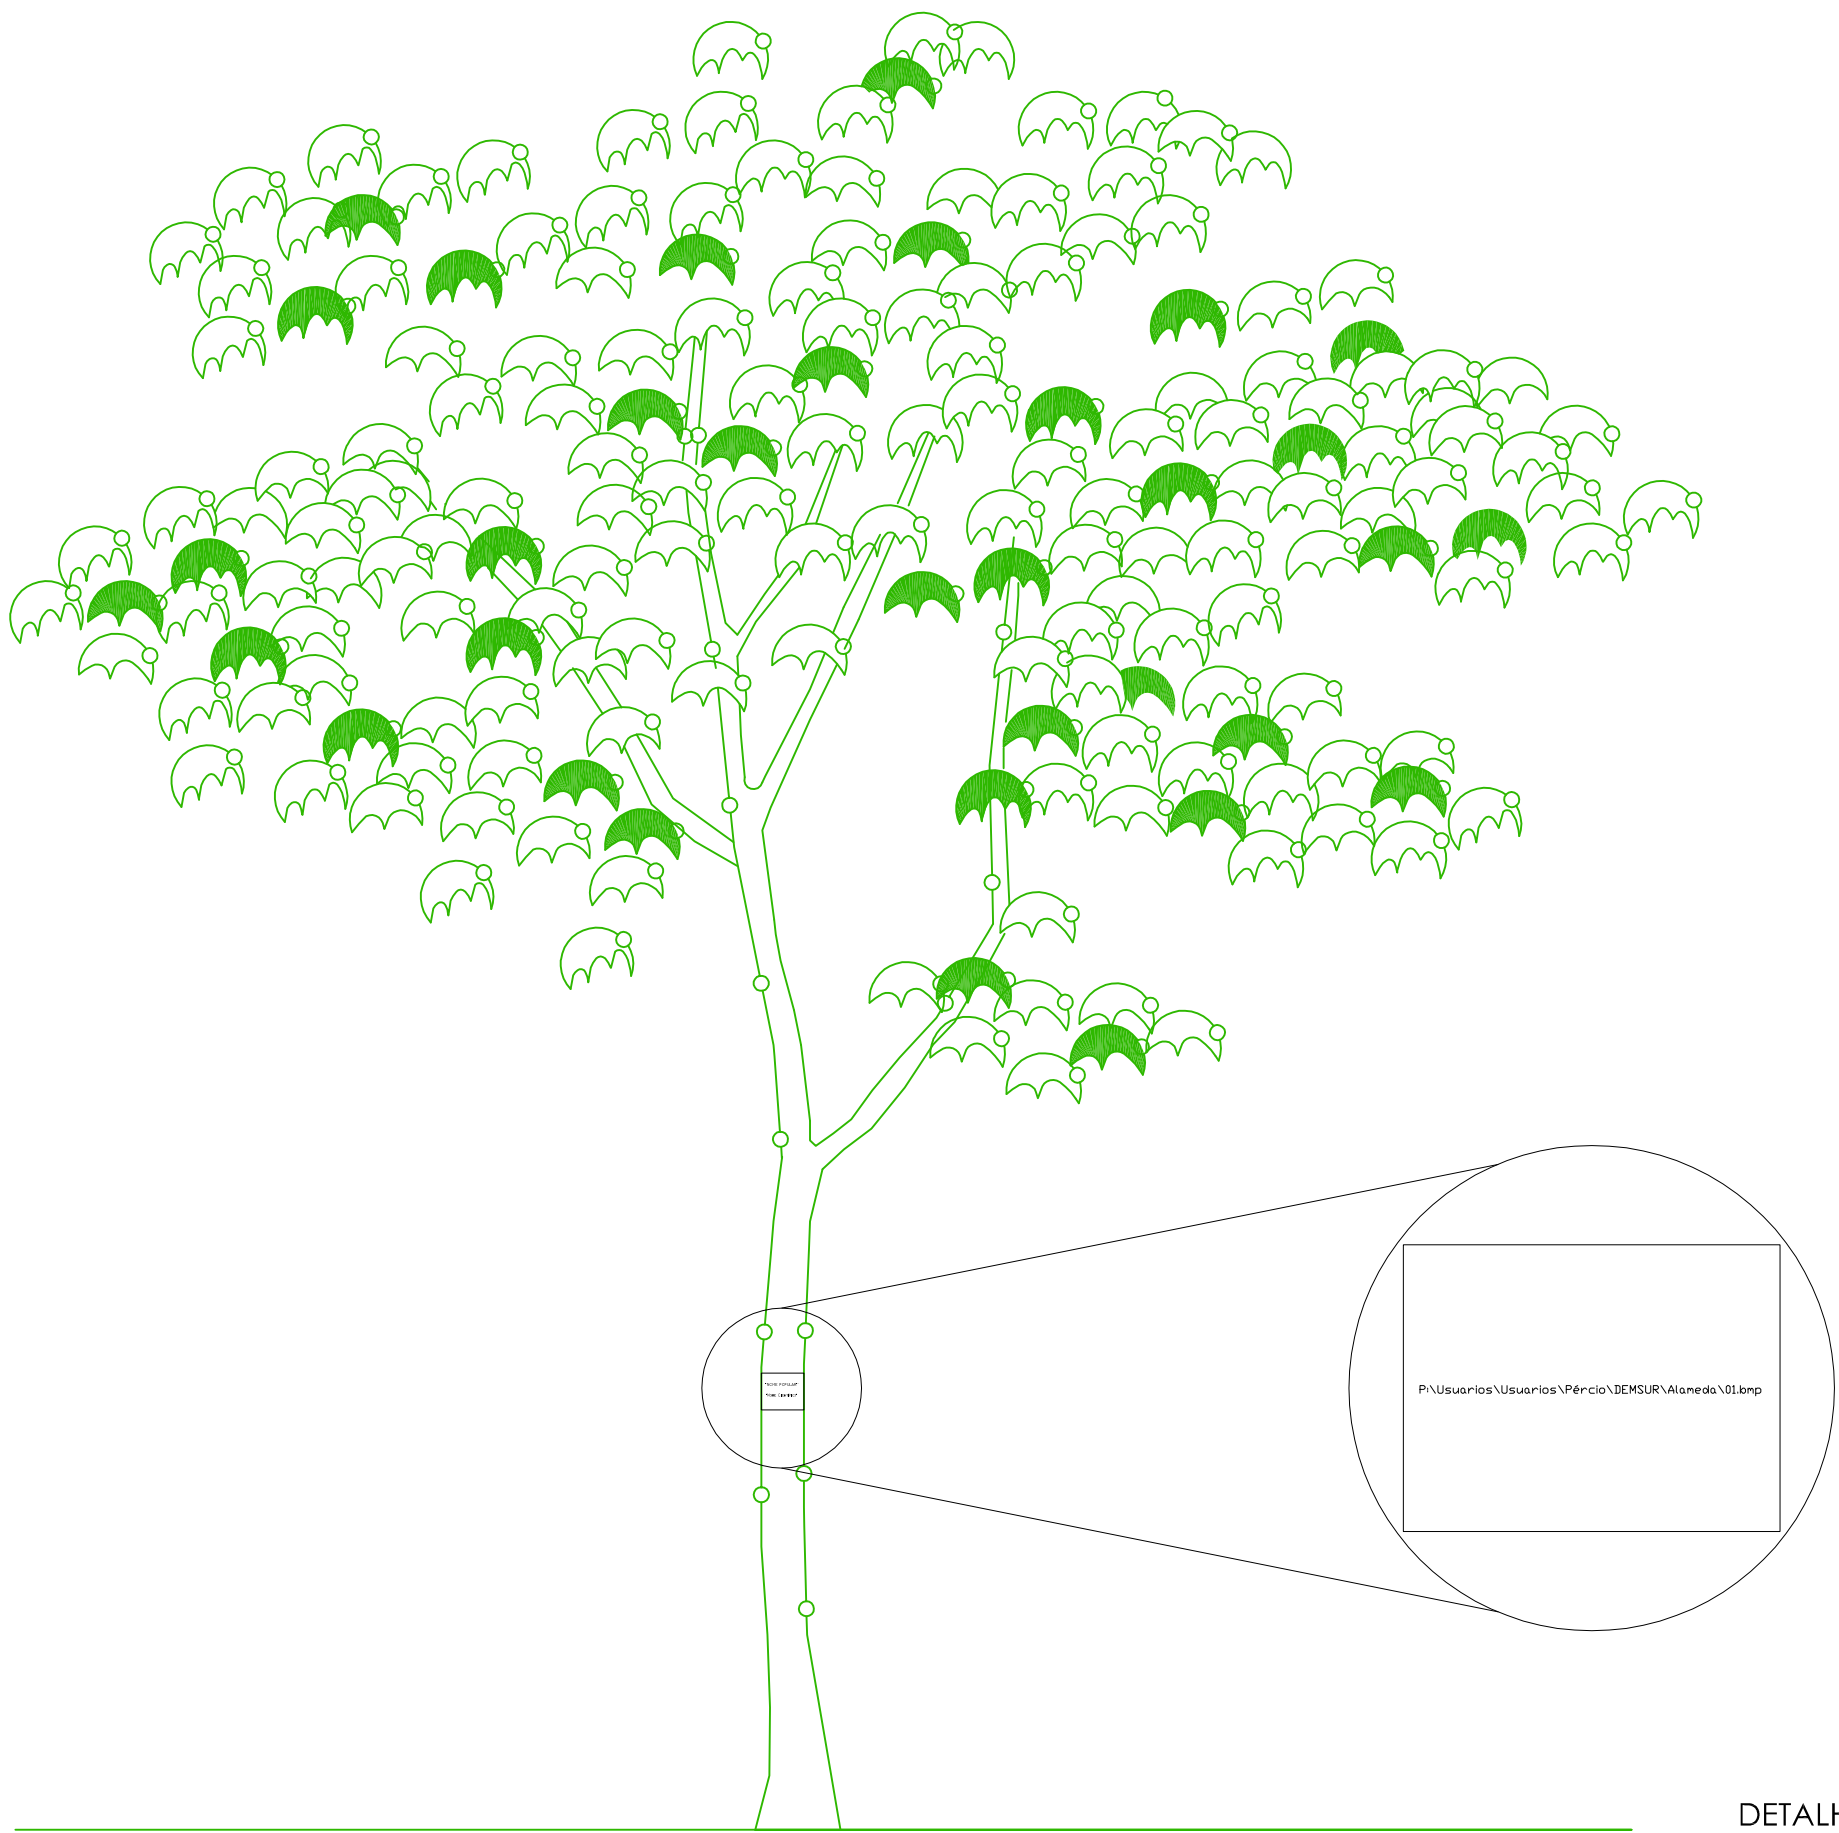

DETALHE IDENTIFICAÇÃO ESPÉCIE
ESC. 1:10

BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
DESCRIÇÃO	MINIMO	MAXIMO	MÉDIA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,30%	8,00%	5,20%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,50%	1,50%	1,00%
SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS	0,25%	1,53%	0,88%
Seguros	0,00%	0,54%	0,24%
Garantias	0,00%	0,42%	0,21%
Riscos	0,25%	0,57%	0,43%
TRIBUTOS	3,65%	3,65%	3,65%
ISS	0,00%	0,00%	0,00%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%
COFINS	3,00%	3,00%	3,00%
Lucro	1,75%	6,50%	4,10%
TOTAL	10,50%	19,60%	15,60%

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ATERRO CONTROLADO - DEMSUR

Município/MG: **MURIAÉ - MG**
Orçamento: **TABELA SINAPI / CEF - MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2014**
TABELA SETOP - MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013
SCO RIO

BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	%	Valor
Administração Central	5,20%	R\$ 1.753,95
Seguros	0,24%	R\$ 80,95
Riscos	0,43%	R\$ 145,04
Garantias	0,21%	R\$ 70,83
Despesas Financeiras	1,00%	R\$ 337,30
Lucro	4,10%	R\$ 1.382,92
Impostos	3,65%	R\$ 1.231,14
BDI = $\frac{(1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)}$	15,76%	R\$ 5.315,40
FONTE: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TC 025.990/2008-2		

BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
DESCRIÇÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,30%	8,00%	5,20%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,50%	1,50%	1,00%
SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS	0,25%	1,53%	0,88%
Seguros	0,00%	0,54%	0,24%
Garantias	0,00%	0,42%	0,21%
Riscos	0,25%	0,57%	0,43%
TRIBUTOS	3,65%	3,65%	3,65%
ISS	0,00%	0,00%	0,00%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%
COFINS	3,00%	3,00%	3,00%
Lucro	1,75%	6,50%	4,10%
TOTAL	10,50%	19,60%	15,60%

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS RECUPERAÇÃO ATERRO CONTROLADO - DEMSUR		
Município/MG:	MURIAÉ - MG	
Orçamento:	TABELA SINAPI / CEF - MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2014	
	TABELA SETOP - MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013	
BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	%	Valor
Administração Central	5,20%	R\$ 3.257,11
Seguros	0,24%	R\$ 150,33
Riscos	0,43%	R\$ 269,34
Garantias	0,21%	R\$ 131,54
Despesas Financeiras	1,00%	R\$ 626,37
Lucro	4,10%	R\$ 2.568,11
Impostos	3,65%	R\$ 2.286,24
BDI = $\frac{(1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)}$	15,76%	R\$ 9.870,79
FONTE: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TC 025.990/2008-2		

BDI PARA OBRAS HIDRICAS - SANEAMENTO BASICO						
DESCRIÇÃO	MINIMO		MAXIMO		MEDIA	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO	Adm Central	Lucro	Adm Central	Lucro	Adm Central	Lucro
Até R\$ 150.000,00	7,70%	9,90%	10,00%	10,00%	8,70%	9,20%
De R\$ 150.000,01 até R\$ 1.500.000,00	7,20%	9,40%	9,50%	9,50%	8,20%	8,70%
De R\$ 1.500.000,01 até R\$ 75.000.000,00	6,70%	8,90%	9,00%	9,00%	7,70%	8,20%
De R\$ 75.000.000,01 até R\$ 150.000.000,00	6,20%	8,40%	8,50%	8,50%	7,20%	7,70%
Acima de 150.000.000,00	5,70%	7,90%	8,00%	8,00%	6,70%	7,20%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,50%		1,50%		1,00%	
SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS	0,35%		2,40%		1,32%	
Seguros	0,00%		0,81%		0,36%	
Garantias	0,00%		0,42%		0,21%	
Riscos						
Obras simples, em condições favoráveis, com execução em ritmo adequado	0,35%		0,85%		0,65%	
Obras medianas em área e/ou prazo, em condições normais de execução	0,40%		0,98%		0,75%	
Obras complexas, em condições adversas, com execução em ritmo acelerado, em áreas restritas	0,48%		1,17%		0,90%	
TRIBUTOS	4,65%		6,15%		5,40%	
ISS	1,00%		até 2,50%		1,75%	
PIS	0,65%		0,65%		0,65%	
COFINS	3,00%		3,00%		3,00%	
BDI						
Até R\$ 150.000,00	25,30%		31,80%		28,30%	
De R\$ 150.000,01 até R\$ 1.500.000,00	24,20%		30,60%		27,10%	
De R\$ 1.500.000,01 até R\$ 75.000.000,00	23,00%		29,40%		25,90%	
De R\$ 75.000.000,01 até R\$ 150.000.000,00	21,90%		28,20%		24,80%	
Acima de 150.000.000,00	20,80%		27,00%		23,60%	

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

RECUPERAÇÃO ATERRO CONTROLADO - DEMSUR

Município/MG: MURIAÉ - MG

Orçamento: TABELA SINAPI / CEF - MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2014

TABELA SETOP - MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

BDI PARA OBRAS HÍDRICAS - REDES ADUTORAS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIA E DE TRATAMENTO		
Descrição	%	Valor
Administração Central	8,20%	R\$ 82.751,43
Seguros	0,36%	R\$ 3.632,99
Riscos	0,65%	R\$ 6.559,56
Garantias	0,21%	R\$ 2.119,24
Despesas Financeiras	1,00%	R\$ 10.091,64
Lucro	8,70%	R\$ 87.797,25
Impostos	5,40%	R\$ 54.494,84
BDI = $(1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)$ (1 - I)	26,99%	R\$ 272.334,85

FONTE: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TC 025.990/2008-2

BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
DESCRIÇÃO	MINIMO	MAXIMO	MEDIA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,30%	8,00%	5,20%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,50%	1,50%	1,00%
SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS	0,25%	1,53%	0,88%
Seguros	0,00%	0,54%	0,24%
Garantias	0,00%	0,42%	0,21%
Riscos	0,25%	0,57%	0,43%
TRIBUTOS	3,65%	3,65%	3,65%
ISS	0,00%	0,00%	0,00%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%
COFINS	3,00%	3,00%	3,00%
Lucro	1,75%	6,50%	4,10%
TOTAL	10,50%	19,60%	15,60%

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
RECUPERAÇÃO ATERRO CONTROLADO - DEMSUR

Município/MG: **MURIAÉ - MG**
Orçamento: **TABELA SINAPI / CEF - MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2014**
TABELA SETOP - MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	%	Valor
Administração Central	5,20%	R\$ 125,28
Seguros	0,24%	R\$ 5,78
Riscos	0,43%	R\$ 10,36
Garantias	0,21%	R\$ 5,06
Despesas Financeiras	1,00%	R\$ 24,09
Lucro	4,10%	R\$ 98,78
Impostos	3,65%	R\$ 87,94
BDI = $\frac{(1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)}$	15,76%	R\$ 379,67
FONTE: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TC 025.990/2008-2		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECUPERAÇÃO DE ATERRO CONTROLADO

Município/MG: **MURIAÉ - MG**
 Orçamento: **TABELA SINAPI / CEF - MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2014**
TABELA SETOP - MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013
SCO RIO

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor	%	SEMANAS			
		R\$	Total	1	2	3	4
1	RESERVATÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CHORUME	2.736,77	100,00%	100,00%			
				2.736,77	0,00	0,00	0,00
2	REDE DE RECALQUE	35.420,66	100,00%		50,00%	50,00%	
				0,00	17.710,33	17.710,33	0,00
3	EQUIPAMENTOS	5.480,34	100,00%				100,00%
				0,00	0,00	0,00	5.480,34
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.723,93	100,00%				100,00%
				0,00	0,00	0,00	2.723,93
TOTAIS		Porcentagem		5,90%	38,20%	38,20%	17,70%
		Total Mensal		2.736,77	17.710,33	17.710,33	8.204,28
		Total Acumulado		2.736,77	20.447,10	38.157,42	46.361,70

Município/MG: **MURIAÉ/MG**
Endereço/Bairro: **ZONA RURAL**
Orçamento: **TABELA SINAPI / CEF - MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2014**

[illegible]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECUPERAÇÃO DE ATERRO CONTROLADO

Município/MG: **MURIAÉ - MG**
 Orçamento: **TABELA SINAPI / CEF - MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2014**

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor	%	MESES			
		R\$	Total	1	2	3	4
1	Instalações Iniciais	4.042,50	100,00%	100,00%			
				4.042,50	0,00	0,00	0,00
2	Drenagem Pluvial	116.887,80	100,00%			100,00%	
				0,00	0,00	116.887,80	0,00
3	Drenagem Profunda - Chorume	163.465,88	100,00%		50,00%	50,00%	
				0,00	81.732,94	81.732,94	0,00
4	Drenagem de Gases	613.634,12	100,00%	100,00%			
				613.634,12	0,00	0,00	0,00
5	Regularização dos Platôs	199.862,16	100,00%	100,00%			
				199.862,16	0,00	0,00	0,00
6	Paisagismo	186.395,11		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				46.598,78	46.598,78	46.598,78	46.598,78
TOTAIS		Porcentagem		67,29%	9,99%	19,09%	3,63%
		Total Mensal		864.137,56	128.331,72	245.219,52	46.598,78
		Total Acumulado		864.137,56	992.469,28	1.237.688,80	1.284.287,58

PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE CHORUME

Município Muriaé
Estado MG
Projeto Recuperação de Aterro Controlado

DADOS GERAIS

PV Montante	caixa de chorume	
Q máx afluyente	1,500	L/s
Cota coletor chegada	299,696	m
Cota do Terreno	301,896	m
Profundidade do Coletor	2,200	m
Diâm. coletor	200	mm
Cota máx recalque	304,880	m
PV jusante (recalque)	tratamento	
Compr. Linha Recalque	566,212	m

DADOS DE VAZÃO

Q máx afluyente	1,500	L/s	
Q bomba	5,400	m³/h	0,0015 m³/s
Cota coletor chegada	299,696	m	
Cota do Terreno	301,896	m	
Cota da Laje do poço	301,896	m	
Diâm. coletor	200	mm	

DADOS DO CONJUNTO MOTOR BOMBA

Potência Calculada	0,18	CV	Conj. motor bomba	BCA-41 3CV Tri
N.º de conjuntos	1	un		
Submergência mínima	0,2	m		
Altura livre de sucção	0,1	m		
Afastamento lateral	0,2	m		
N.º de conjuntos reserva	1	un		
Q bomba 1	1,500	L/s	0,09	m³/min
Q bomba 1+2		L/s		m³/min
Q bomba 1+2+3		L/s		m³/min
Recuo	0,2	m		

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Var. Nível desejada	0,8	m	
T (tempo de ciclo)	10	min	(SABESP, Flomatcher e Metcalf & Eddy)

DIMENSÕES DO POÇO

Volume Útil (V=QT/4)	0,225	m³	Prismático	
Largura Calc.	0,53	m	Largura	2,4 m
Comp. Calc.	0,53	m	Comp.	10 m
Prof. Calc.	3,3	m	Prof.	2,2 m
Área	0,28	m²	Área	24 m²
Volume Total	0,93	m³	V Total	52,80 m³
Cotas			Cilindrico	
Nível Máx	299,60	m	Diâm. Eq.	0,60 m
Nível Mín	298,80	m	Diâm. Ad.	1,2 m
Cota de Fundo	298,60	m	Área	1,13 m²
Extravasor	299,70	m	V Total	3,73 m³

PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE CHORUME

Município Muriaé
Estado MG
Projeto Recuperação de Aterro Controlado

LINHA DE RECALQUE

Q recalque	0,0015	m³/s		
Cota mínima do Poço	298,796	m		Coef. Rug.
Cota Máx de Recalque	304,880	m		Ferro Fundido 90
Comprimento da Linha	566,212	m		PVC e PEAD 140
Coef. Rug. Rec. adotado	140	PVC		
Coef. Manning "n"	0,01	PVC		
Altura Geométrica	6,08	m		
Diâm. Recalque Calculado	34,86	mm	(Fórm. Bresse)	
Diâm. Recalque adotado	100,00	mm	0,100	m 0,0079 m²
Velocidade	0,19	m/s		V²/2g 0,0019 m

Perda de Carga Acidental

Peças e Conexões	Quant.	K	hp	hp rec.
Curva 90º	5	0,4	0,000744	0,0037
Curva 45º	5	0,2	0,000372	0,0019
Curva 22,5º	3	0,1	0,000186	0,0006
Válv. Retenção	2	2,5	0,004648	0,0093
Válv. Gaveta	2	0,2	0,000372	0,0007
Redução	0	0,15	0,000279	0,0000
Ampliação	0	0,3	0,000558	0,0000
Curva em Tê	0	0,9	0,001673	0,0000
Junção	0	0,4	0,000744	0,0000
Barrilete	0	3,65	0,006786	0,0000
			Total	0,0162 m



Perda de Carga Distribuída

V² =	0,04	D³/4 =	0,177828
J =	0,00013025	m/m	
h =	0,073748927	m	

AMT - Alt. Man. Total	6,17	m
Vazão de cada Bomba	5,40	m³/h


Red - 0.1mm	Cyan - 0.4mm	White - 0.25mm
Yellow - 0.2mm	Blue - 0.5mm	140 - 0.2mm
Green - 0.3mm	Magenta - 0.6mm	090 - 0.3mm

PENAS

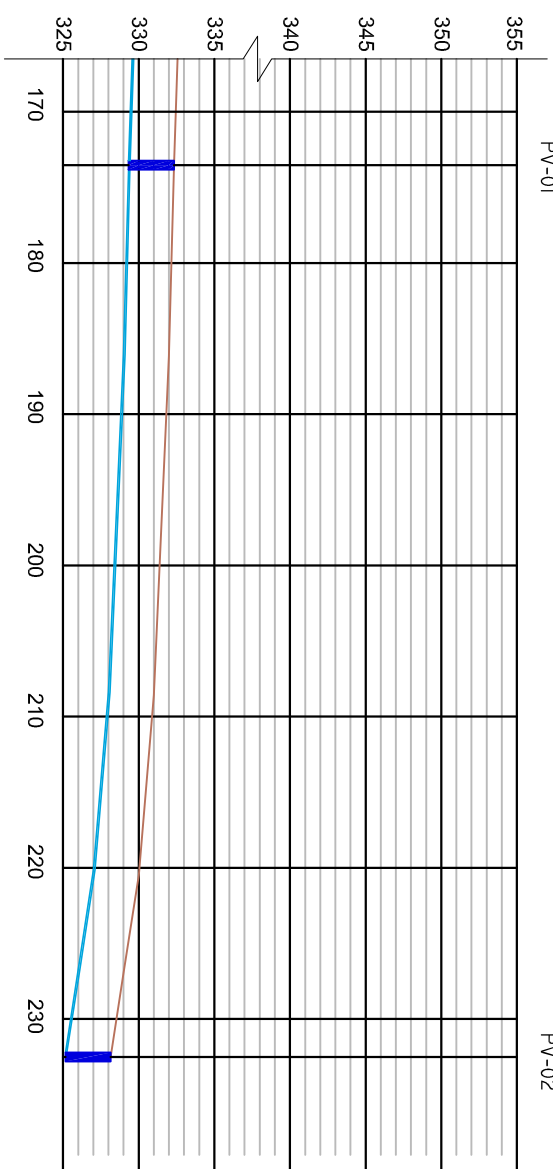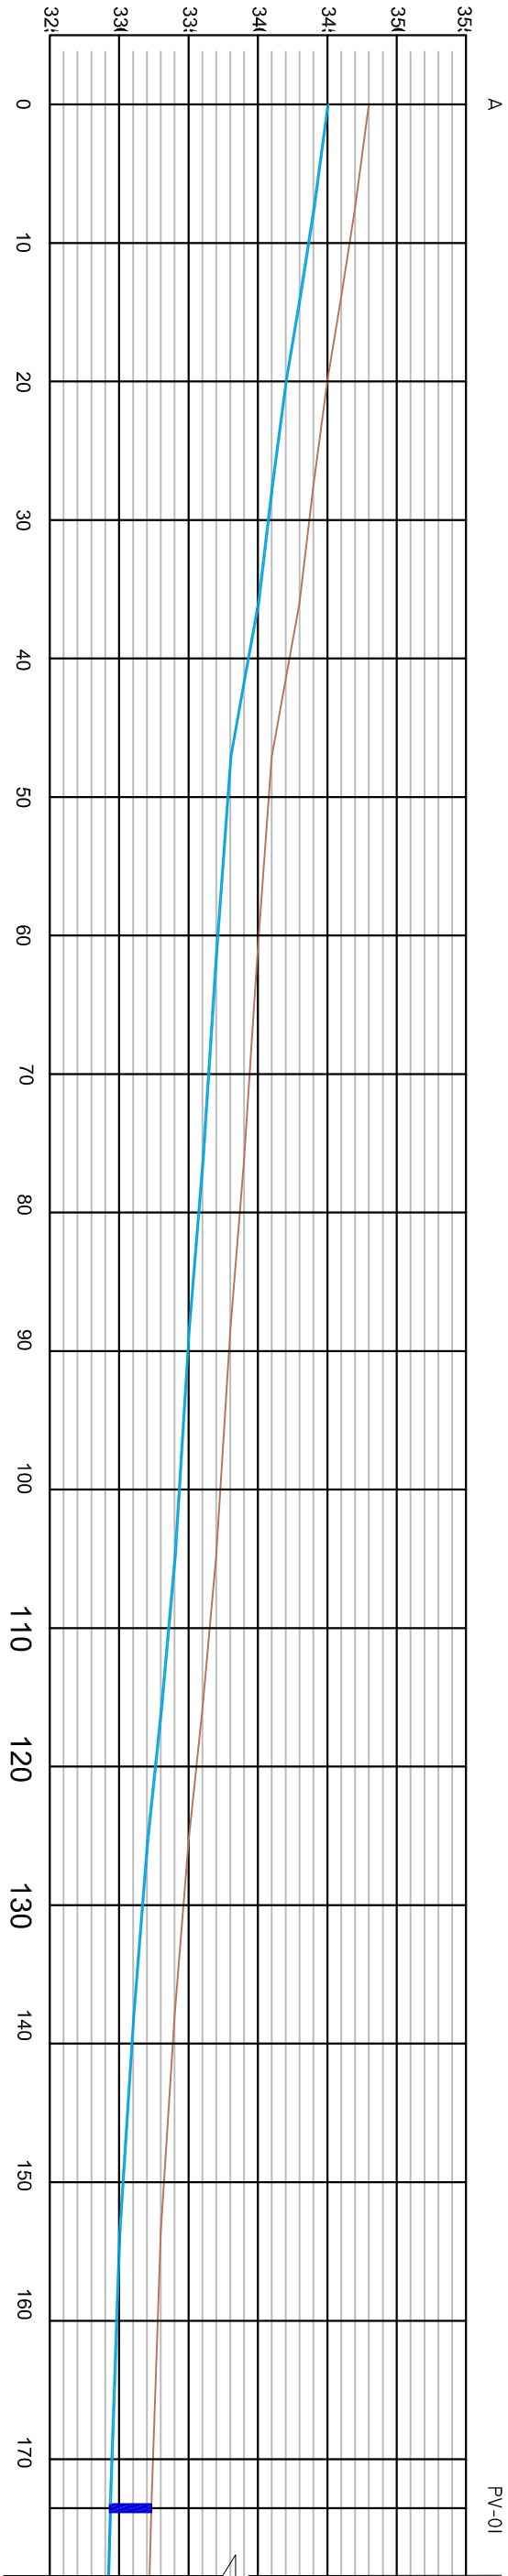

PERFIL DRENAGEM CHORUME (TRECHO A-PV02)

ESC: 1:500



PERFIL DRENAGEM CHORUME (TRECHO B-PV02)

ESC: 1:500

- LEGENDA
- Poço de visita (H = 3,00 m)
 - Tubo de concreto perfurado (DN 200)
 - Perfil do terreno

OBS:	www.biokratos.com.br		atendimento@biokratos.com.br		DESENHO:	PMM-PROJETO RECUPERAÇÃO DE ATERRO CONTROLADO-02 (BBA)		CLIENTE:	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA - DEMSUR		ESCALA:	I/500
					NOME ARQUIVOS:	PMM-DRENAGEM CHORUME DXF		PROJETO/TÍTULO	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO		DATA:	MARÇO - 2014
					REVISÃO:	R0		NOME DO RT / REGISTRO:	Jadna Rocha de Amorim Marques Crea: MG 134.177/D		Nº DESENHO:	02/03



S O L U Ç Õ E S

A M B I E N T A I S


A3

+55 (32) 3215 - 9894

PROIBIDA REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA

White - 0.25mm	Cyan - 0.4mm	Red - 0.1mm
140 - 0.2mm	Blue - 0.5mm	Yellow - 0.2mm
090 - 0.3mm	Magenta - 0.6mm	Green - 0.3mm

PENAS

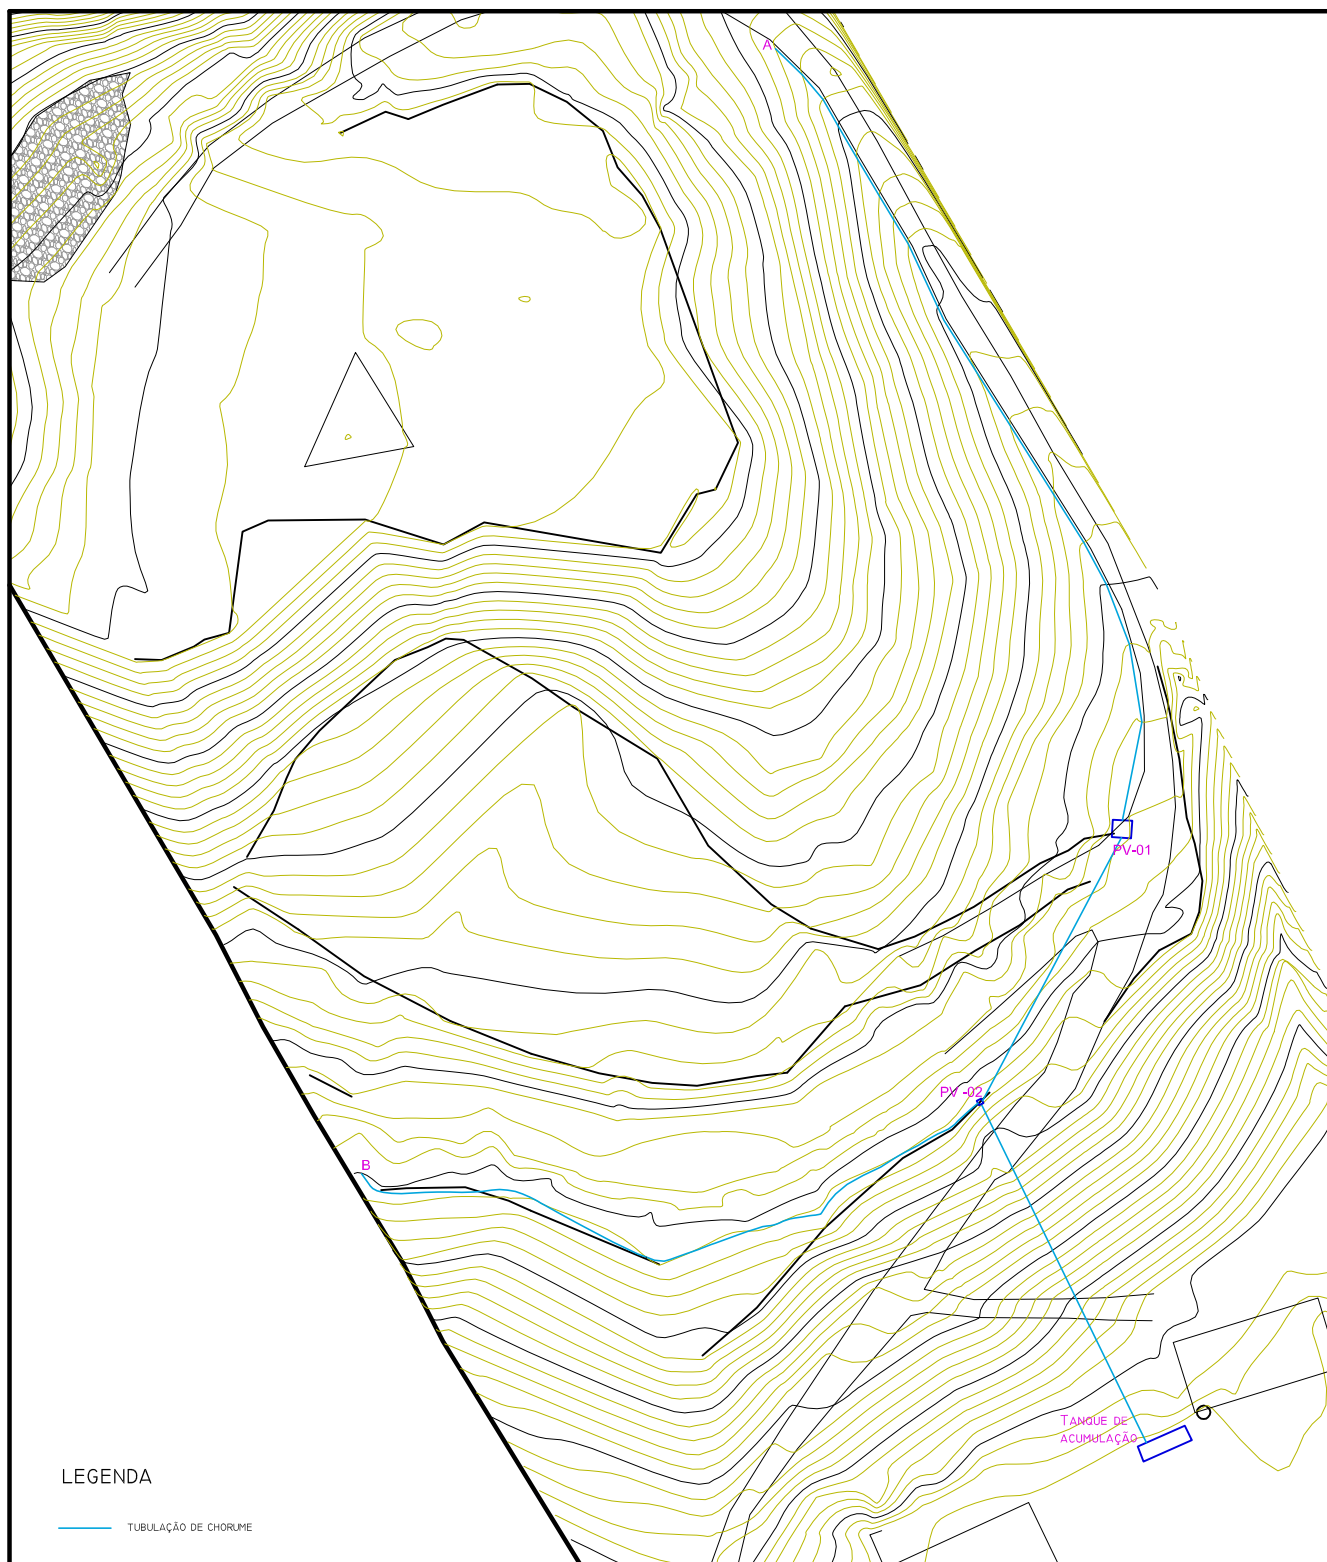

Biokratos
SOLUÇÕES
AMBIENTAIS

A4

www.biokratos.com.br

Tel:(32)3215-9894

Juiz de Fora M.G.

atendimento@biokratos.com.br

CLIENTE:

DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA - DEMSUR

PROJETO/TÍTULO:

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO
TRAÇADO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE CHORUME

ESCALA:

1/1500

DESENHO:

PMM-TRAÇADO TUBULAÇÃO-01-BBA

DATA:

MARÇO-2014

Nº DESENHO

01/03

Nº REVISÃO:

R0

ASS. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Jadna Rocha de Amorim Marques Crea: MG 134.177/D


NOME ARQUIVO:

PPM-PROJETO DRENAGEM CHORUME-DRENAGEM CHORUME.DX F

PROIBIDA REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA

White - 0.25mm	Cyan - 0.4mm	Red - 0.1mm
140 - 0.2mm	Blue - 0.5mm	Yellow - 0.2mm
090 - 0.3mm	Magenta - 0.6mm	Green - 0.3mm

PENAS

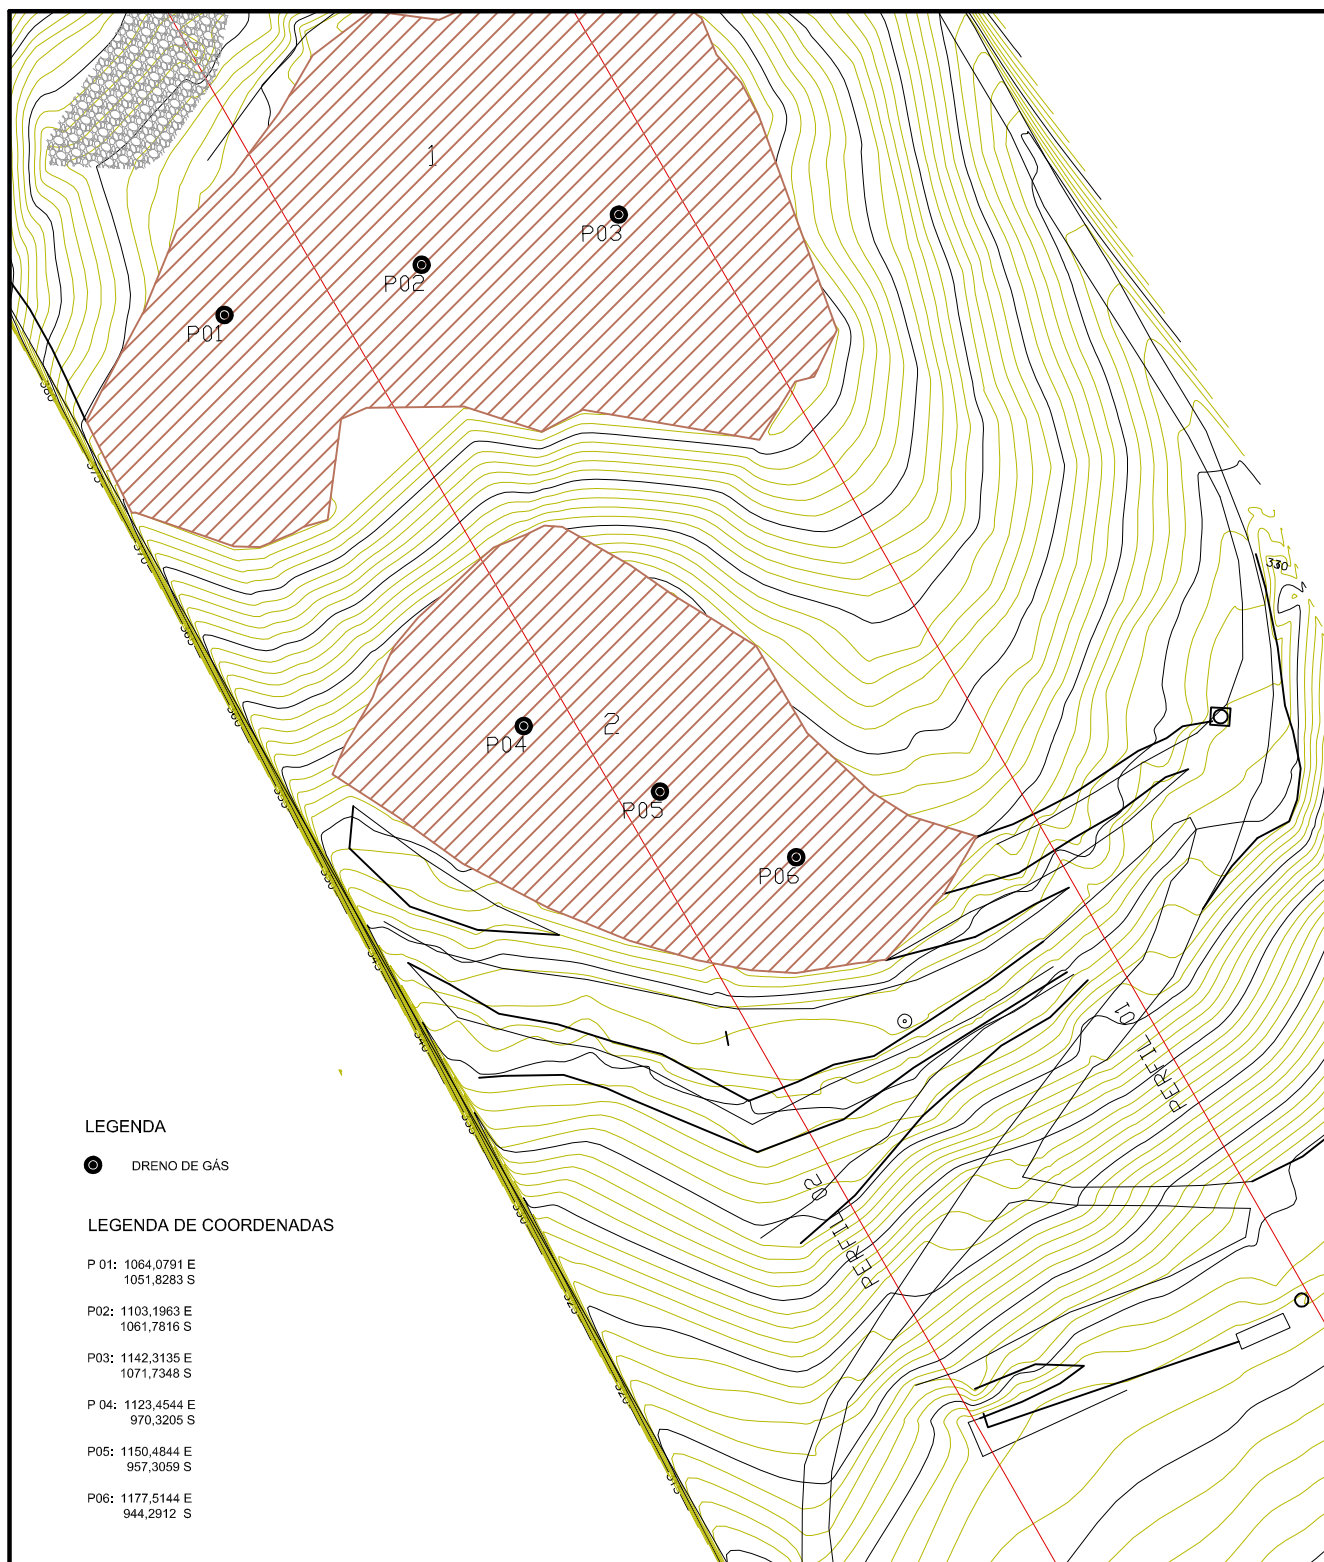

Biokratos
SOLUÇÕES
AMBIENTAIS

A4

www.biokratos.com.br

Tel:(32)3215-9894

Juiz de Fora M.G.

atendimento@biokratos.com.br

CLIENTE:

DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA - DEMSUR

PROJETO/TÍTULO:

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO
LOCALIZAÇÃO DRENO DE GÁS

ESCALA:

1/1500

DESENHO:

PMM-LOCALIZAÇÃO DRENO DE GÁS-01-BBA

DATA:

MARÇO-2014

Nº DESENHO

01/02

Nº REVISÃO:

R0

ASS. RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Jadna Rocha de Amorim Marques Crea: MG 134.177/D

NOME ARQUIVO:

PPM-LOCALIZAÇÃO DRENO DE GÁS-DRENAGEM DE GÁS.DX F

PROIBIDA REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA

Red - 0,1mm	Cyan - 0,4mm	White - 0,25mm
Yellow - 0,2mm	Blue - 0,5mm	140 - 0,2mm
Green - 0,3mm	Magenta - 0,6mm	090 - 0,3mm

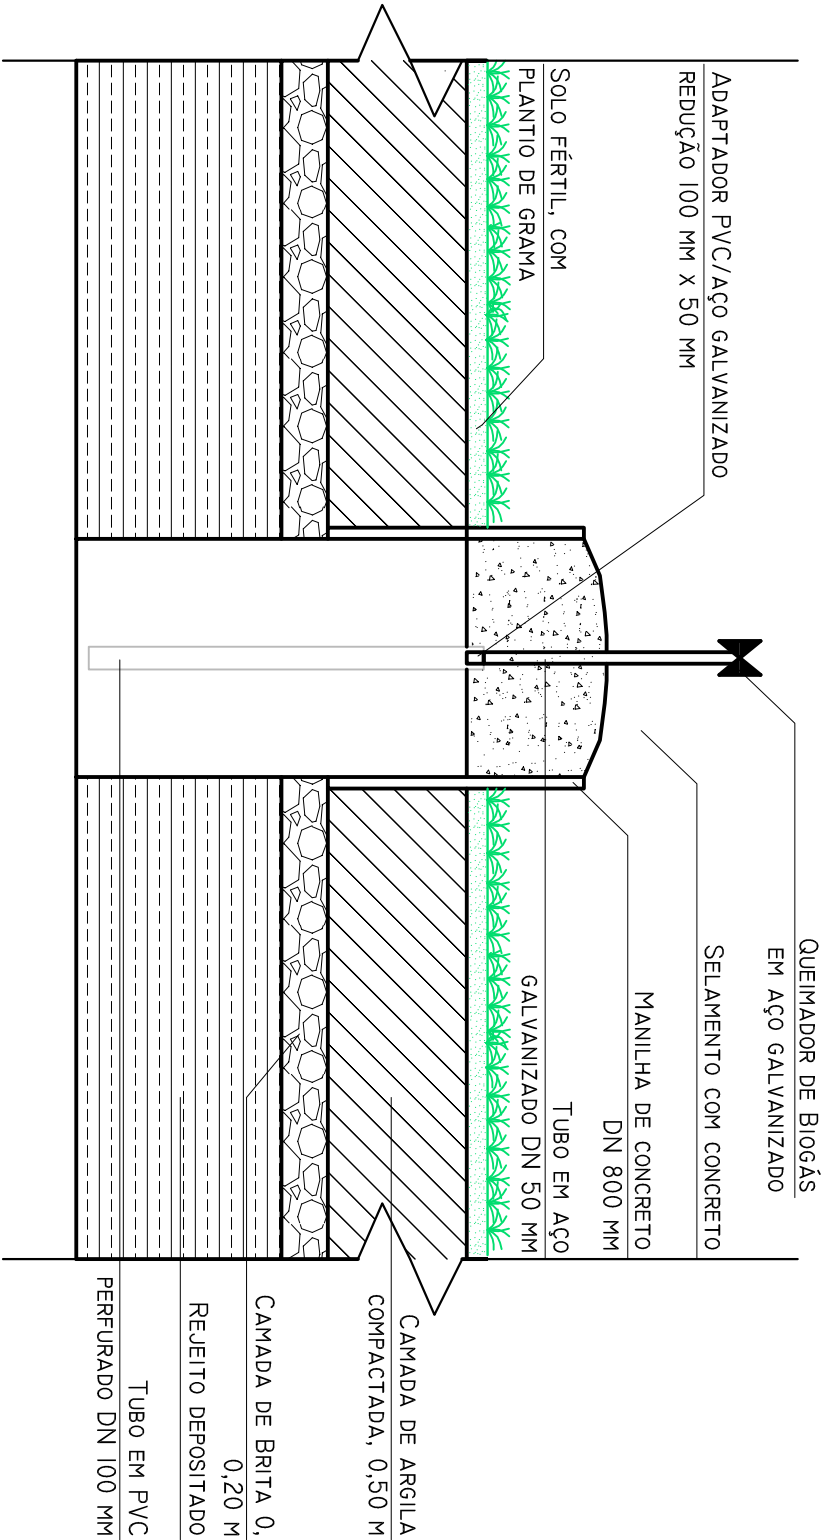

DETALHAMENTO DO DRENO DE GÁS
Esc: 1:50

www.biokratos.com.br atendimento@biokratos.com.br



Biokratos
S O L U Ç Õ E S
A M B I E N T A I S

A4

+55 (32) 3215 - 9894

CLIENTE:

DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA - DEMSUR

PROJETO:

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO
Detalhamento do sistema de Drenagem de Gás

ESCALA:

SEM ESCALA

DESENHO:

PIM-SISTEMA DE DRENAGEM DE GÁS-03-BBA

DATA:

MARÇO-2014

Nº DESENHO:

02/02

Nº REVISÃO:

R0

ASS.: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Jadna Rocha de Amorim Marques Crea: MG 134.177/D

Red - 0.1mm

Yellow - 0.2mm

Green - 0.3mm

Cyan - 0.4mm


Blue - 0.5mm

Magenta - 0.6mm

White - 0.25mm

140 - 0.2mm

090 - 0.3mm

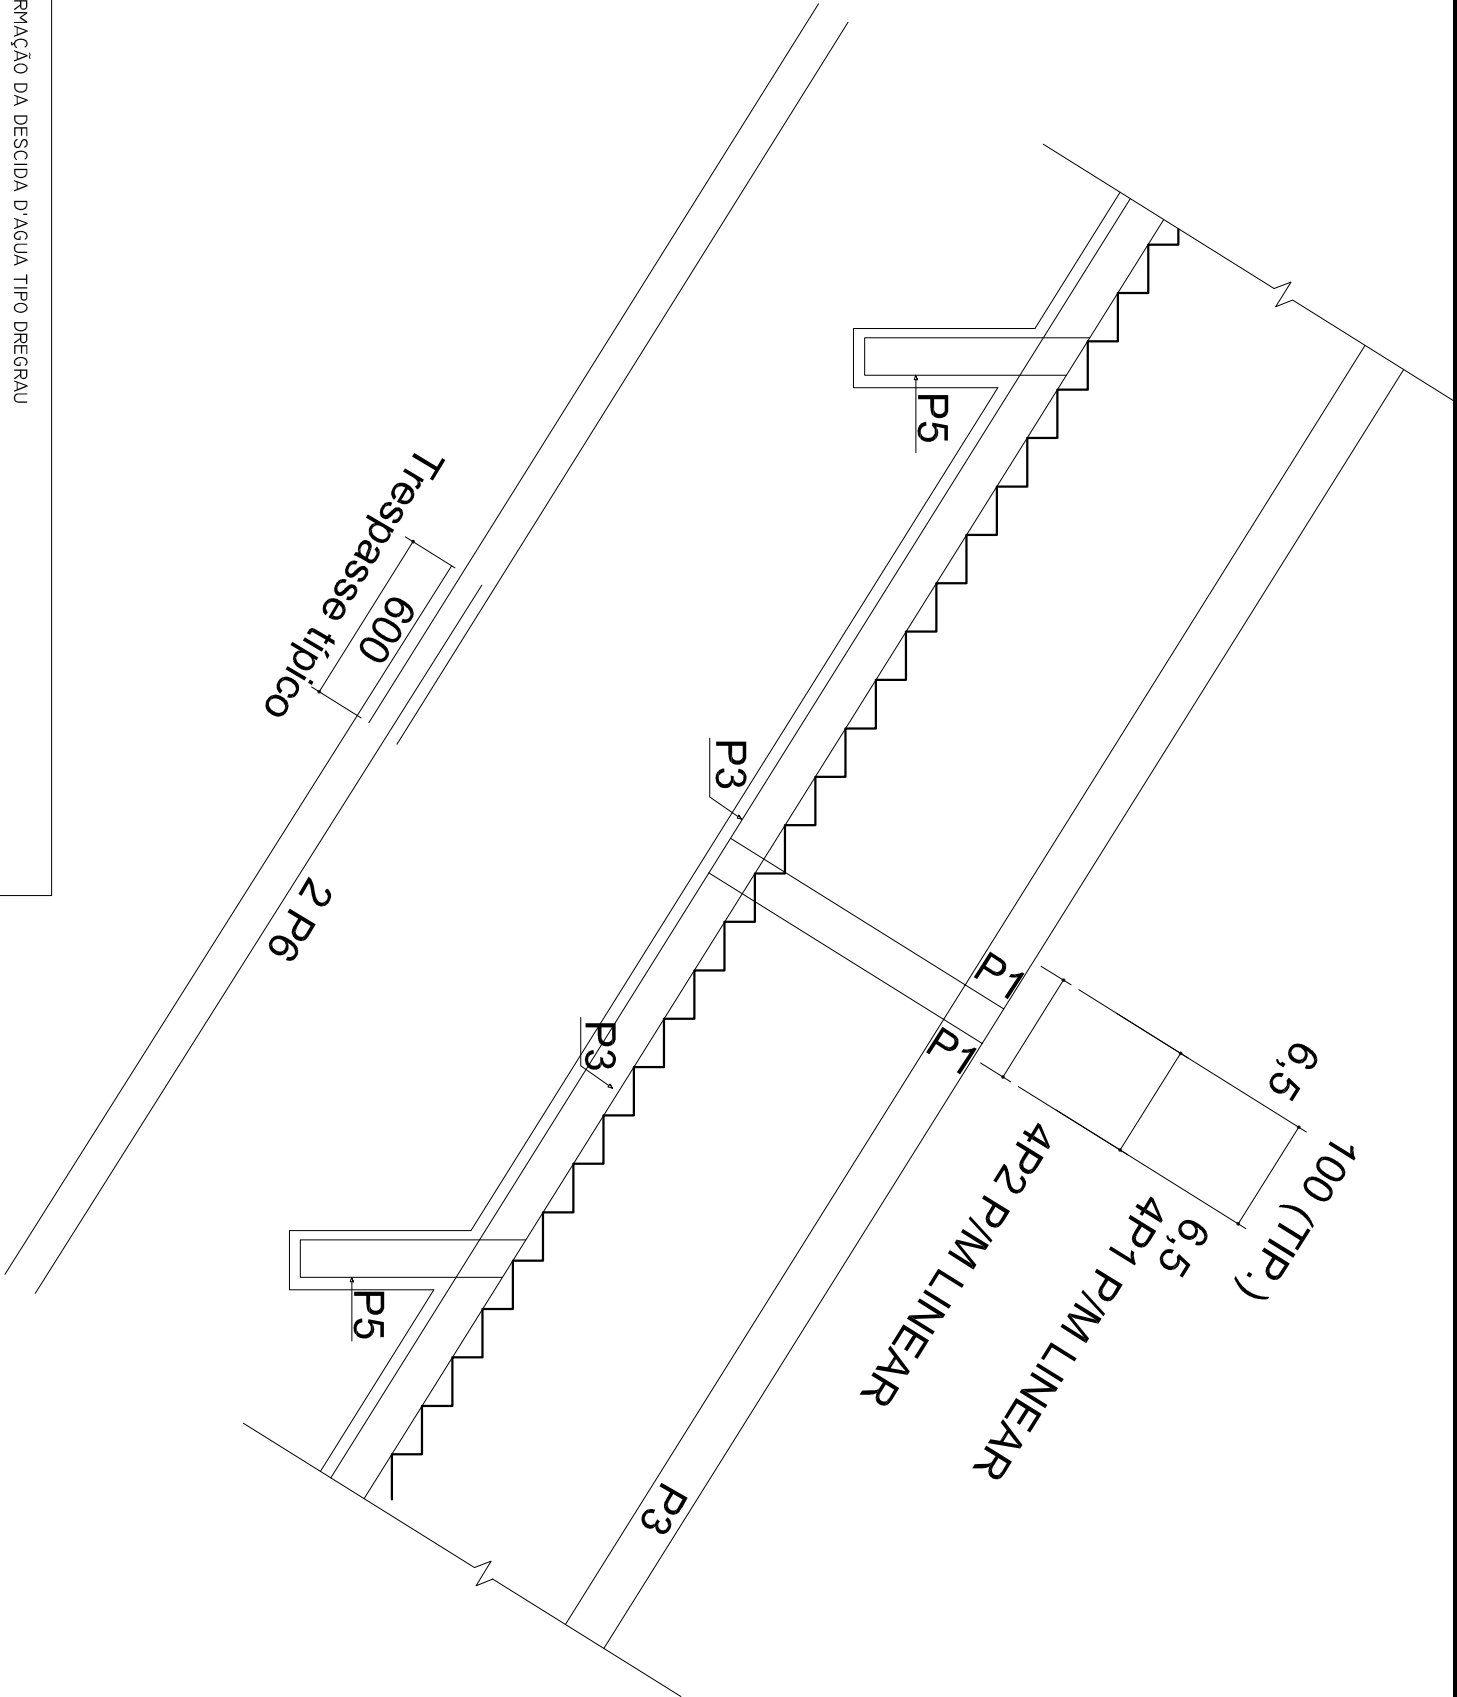

ARMAÇÃO DA DESCIDA D'ÁGUA TIPO DREGRAU			
POSICÃO	DIÂMETRO (mm)	QUANTIDADE	ESPAÇAMENTO (cm)
P1	6,3000	4 *	671
P2	6,3000	4 *	731
P3	4,2000	80	CORR
P4	6,3000	4	235
P5	4,2000	13	232
P6	10	2	CORR

*QUANTIDADE POR METRO

PROIBIDA REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA

OBS:

www.biokratos.com.br

atendimento@biokratos.com.br

A3



Biokratos

S O L U Ç Õ E S

A M B I E N T A I S

+55 (32) 3215 - 9894

DESENHO:

PPM-DETALHE ARMAÇÃO SEÇÃO LONGITUDINAL-03 (BBA)

CLIENTE:

DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA - DEMSUR

ESCALA:

1/25

NOME ARQUIVOS:

PPM-DRENAGEM PLUVIAL.DXF

PROJETO/TÍTULO

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO

DATA:

MARÇO - 2014

REVISÃO:

R0

NOME DO RT / REGISTRO:




Jadna Rocha de Amorim Marques Crea: MG 134.177/D

Nº DESENHO:

03/05

Red - 0.1mm	Cyan - 0.4mm	White - 0.25mm
Yellow - 0.2mm	Blue - 0.5mm	140 - 0.2mm
Green - 0.3mm	Magenta - 0.6mm	090 - 0.3mm

PENAS

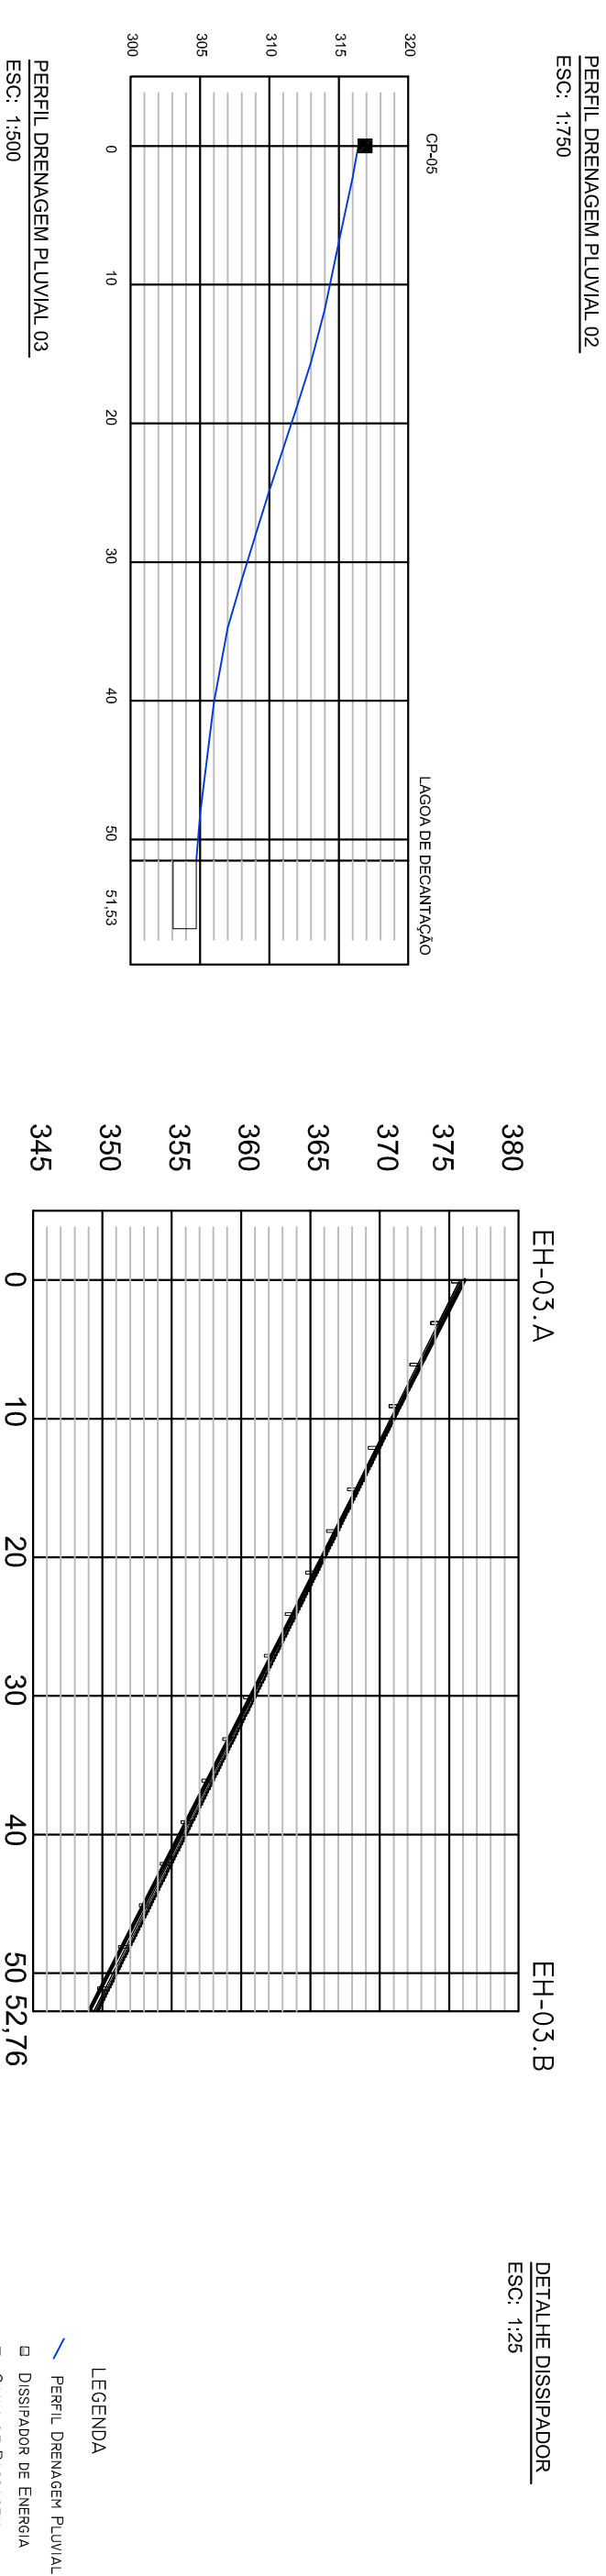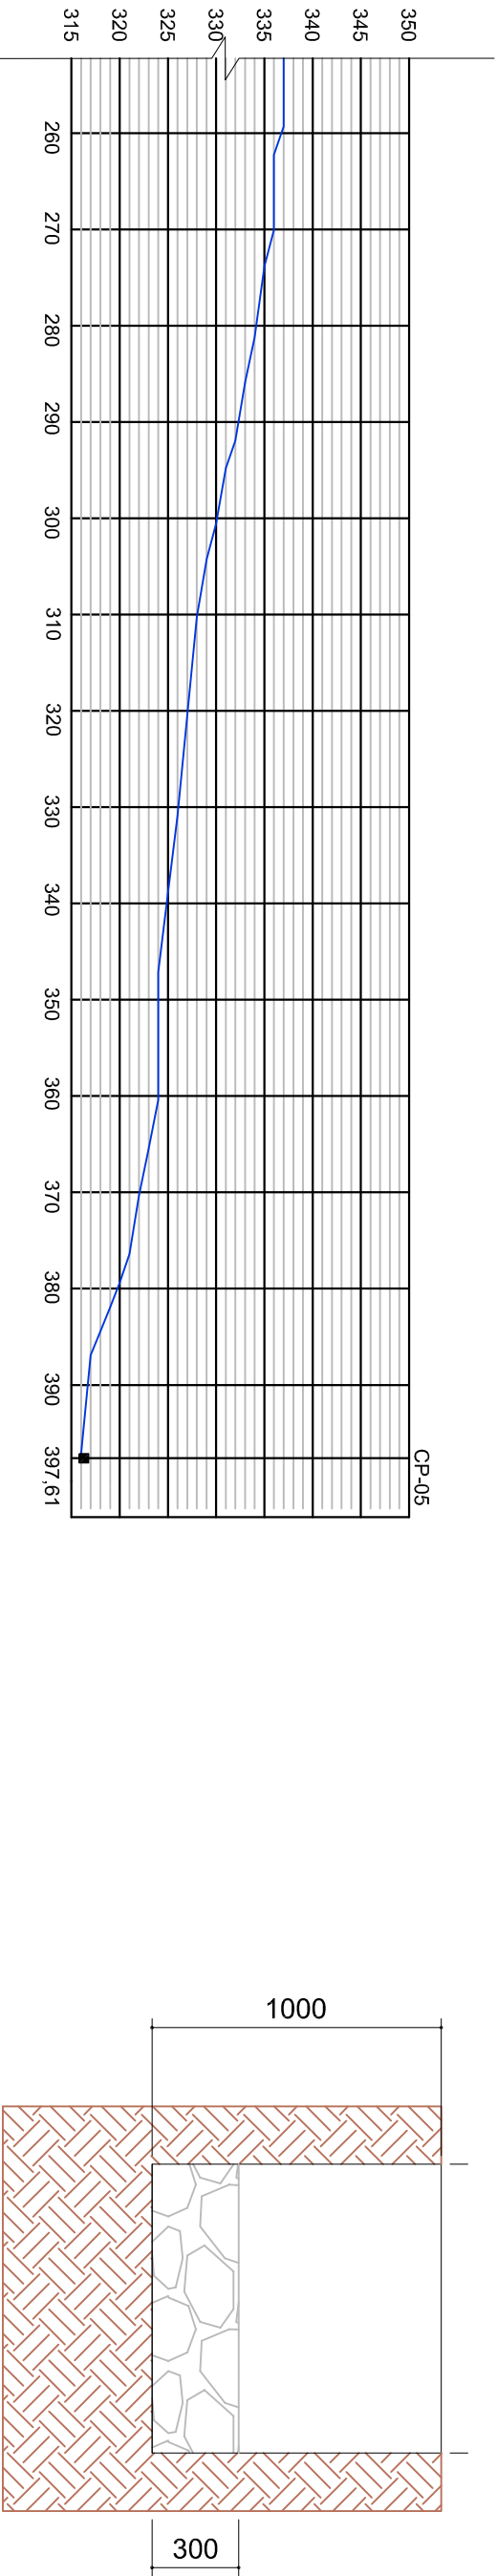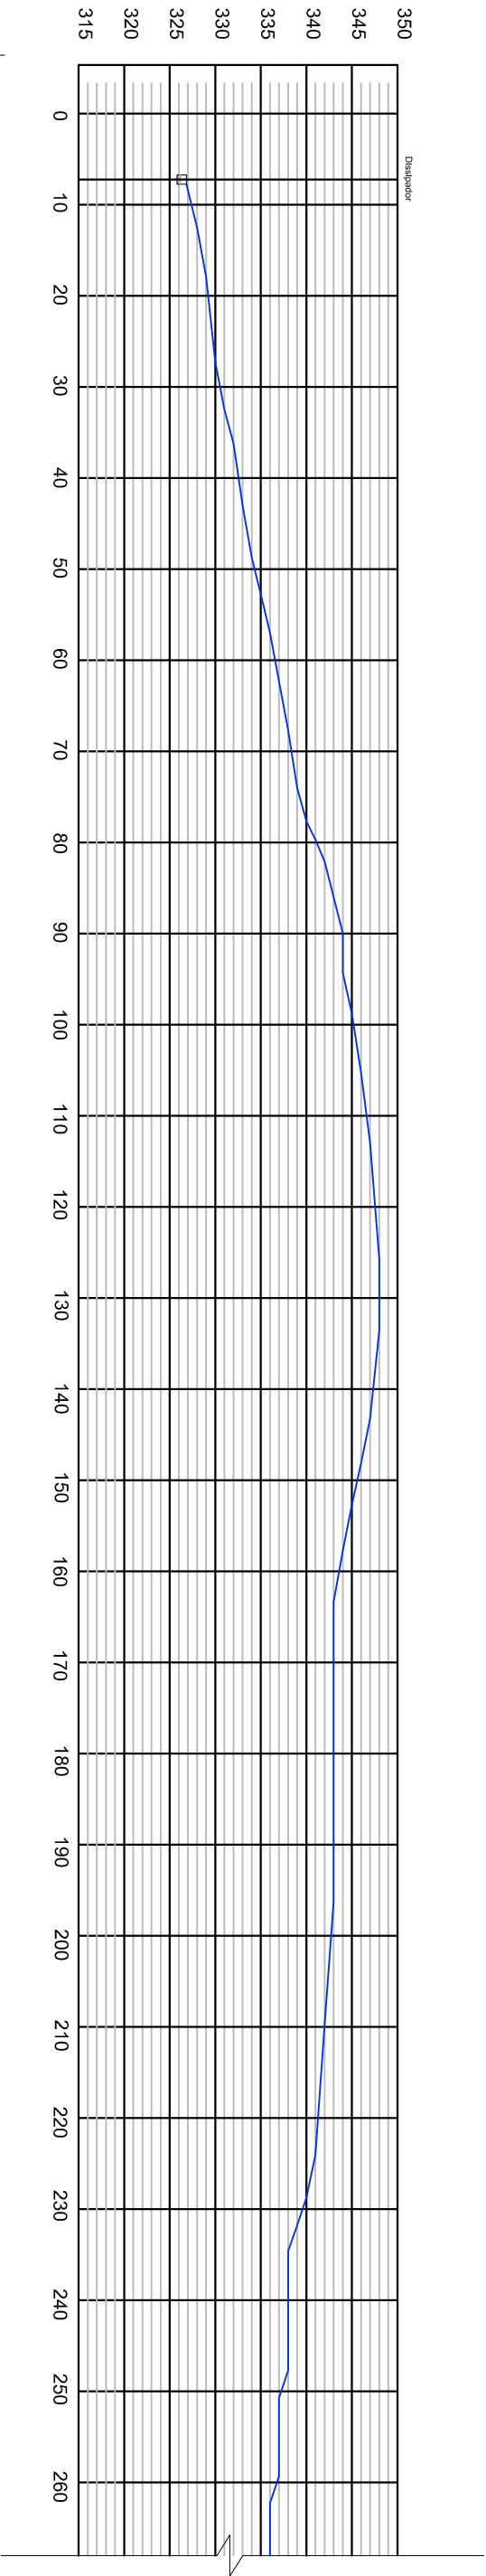

PROIBIDA REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA

OBS:	www.biokratos.com.br	atendimento@biokratos.com.br	DESENHO: PMM-Perfil Drenagem Pluvial-07 (BBA)	CLIENTE: DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA - DEMSUR	INDICADAS
			NOME ARQUIVOS: PMM-PROJETO DRENAGEM PLUVIAL.DXF	PROJETO/TÍTULO: PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO DRENAGEM PLUVIA - PERFIL DRENAGEM 02 E ESCADA HIDRÁULICA 03	DATA: MARÇO - 2014
			REVISÃO: R0	NOME DO RT / REGISTRO: Jadna Rocha de Amorim Marques Crea: MG 134.177/D	Nº DESENHO: 05/05




A3

+55 (32) 3215 - 9894

White - 0.25mm	Cyan - 0.4mm	Red - 0.1mm
140 - 0.2mm	Blue - 0.5mm	Yellow - 0.2mm
090 - 0.3mm	Magenta - 0.6mm	Green - 0.3mm

PENAS

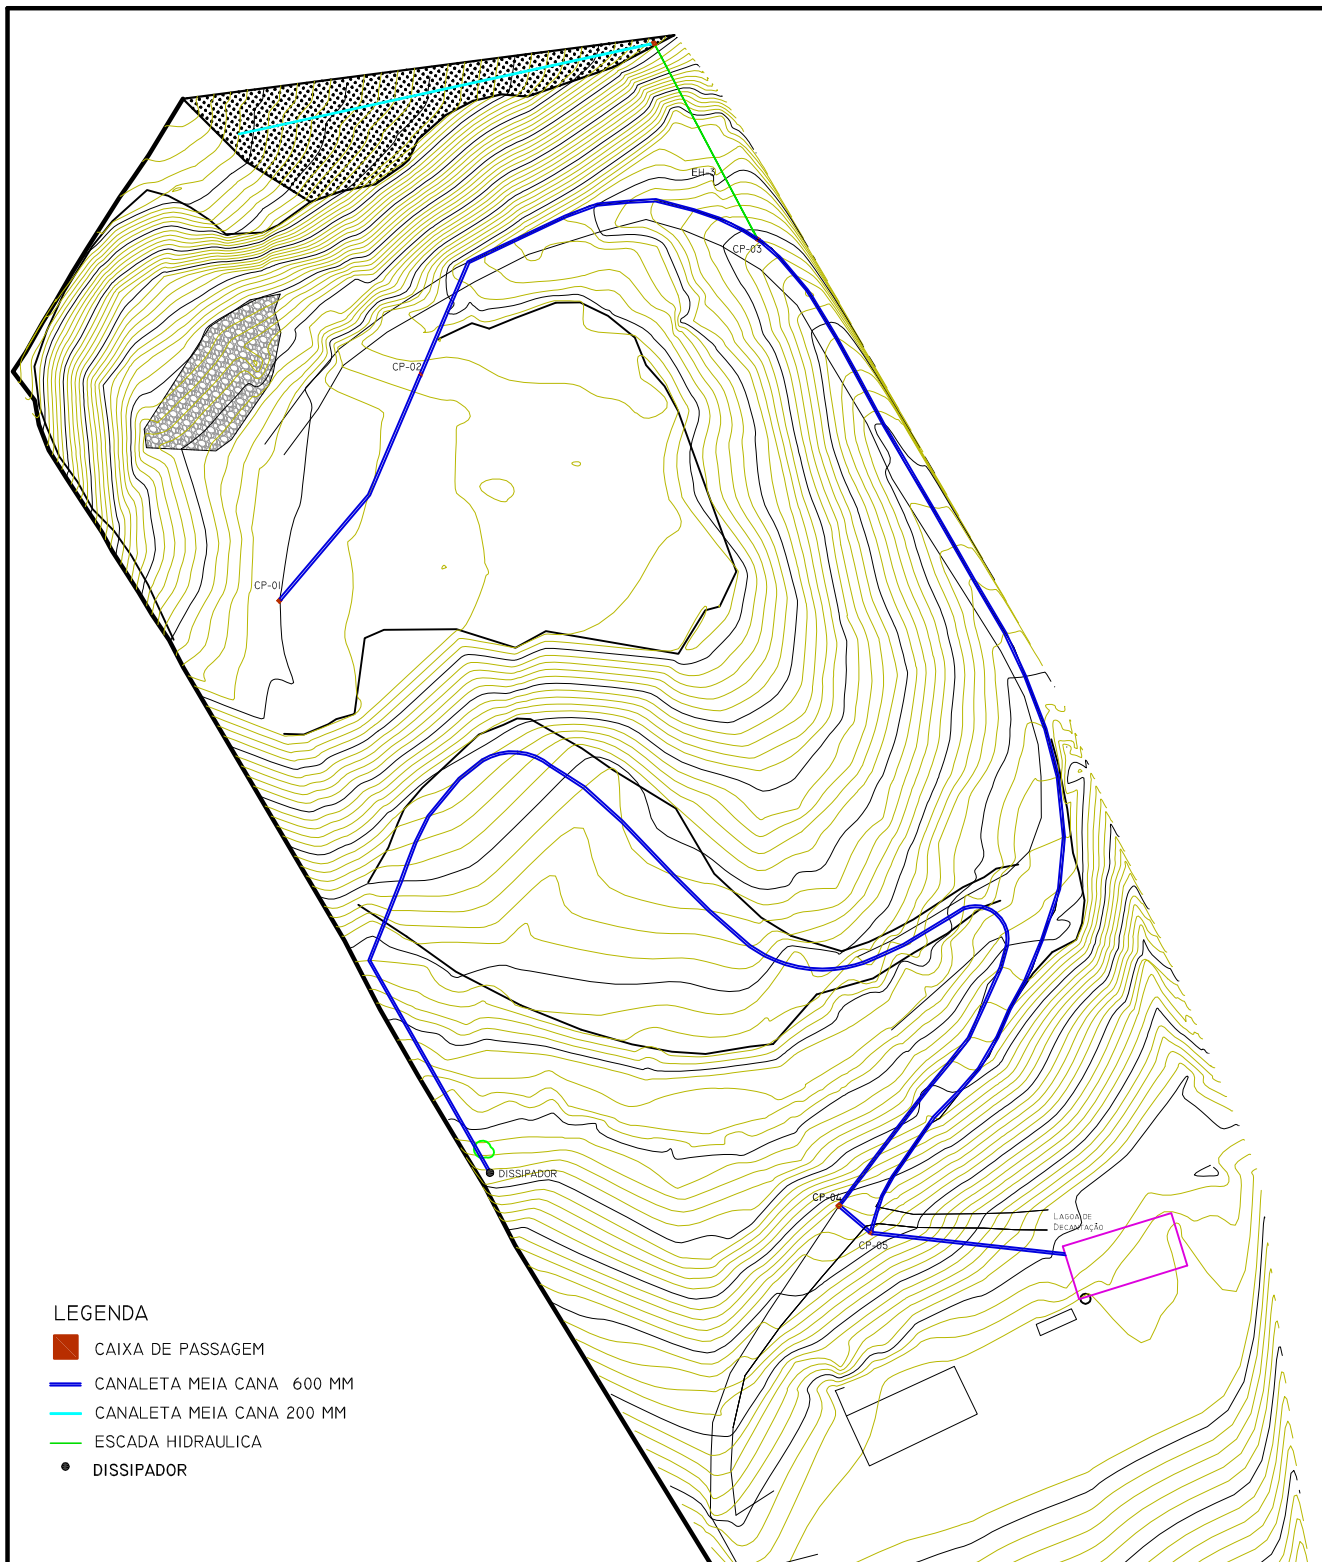

LEGENDA

- CAIXA DE PASSAGEM
- CANALETA MEIA CANA 600 MM
- CANALETA MEIA CANA 200 MM
- ESCADA HIDRAULICA
- DISSIPADOR



Biokratos
SOLUÇÕES
AMBIENTAIS

A4

www.biokratos.com.br

Tel:(32)3215-9894

Juiz de Fora M.G.

atendimento@biokratos.com.br

CLIENTE:

DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA - DEMSUR

PROJETO/TITULO:

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO
TRAÇADO REDE PLUVIAL

ESCALA:

1/2000

DESENHO:

PPM-Drenagem Pluvial-01-BBA

DATA:

MARÇO/2014

Nº DESENHO

01/05

Nº REVISÃO:

R0

ASS. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Jadna Rocha de Amorim Marques Crea: MG 134.177/D

NOME ARQUIVO:

PPM-Drenagem Pluvial.DXF

White - 0.25mm
140 - 0.2mm
090 - 0.3mm

Cyan - 0.4mm
Blue - 0.5mm
Magenta - 0.6mm

Red - 0.1mm
Yellow - 0.2mm
Green - 0.3mm

PENAS

LEGENDA

- ESTRADA
- CERCA
- TUBULAÇÃO DE CHORUME

DISTANCIA	COTA
0	304,880
30,2841	304,880
97,9124	304,880
110,5661	304,000
118,7548	303,000
126,0173	302,000
133,2549	301,000
140,4167	300,000
147,3346	299,000
154,2525	298,000
161,1704	297,000
168,0872	296,000
175,9041	265,000
183,721	294,000
191,5379	293,000
199,3547	292,000
206,354	291,000
213,0836	290,000
219,8132	289,000
226,5428	288,000
233,2724	287,000
240,1105	286,000
251,829	285,000
263,6285	285,000
294,3356	285,000
325,5377	286,000
345,6915	287,000
347,3773	288,000
348,7987	289,000
350,7549	290,000
358,0928	290,000
361,3806	289,000
365,2447	289,000
368,4229	290,000
371,9383	291,000
372,915	291,545
374,3322	292,000
380,6099	293,000
386,2095	293,616
388,6622	294,000
394,5463	295,000
400,4436	296,000
406,3569	297,000
412,6027	298,000
418,8284	299,000
425,0443	300,000
432,5282	301,000
437,9472	301,706
533,0062	301,706
566,2122	301,896

www.biokratos.com.br atendimento@biokratos.com.br



Biokratos
SOLUÇÕES
AMBIENTAIS

+55 (32) 3215 - 9894

CLIENTE:

DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA - DEMSUR

PROJETO:

Projeto Estação Elevatória - Aterro Controlado
Traçado linha de recalque

ESCALA:

1/1500

DESENHO:

EE_MURIAE-PCP001

DATA:

MARÇO-2014

Nº DESENHO:

01/03




Nº REVISÃO:

R0_PCP_07/03/14

ASS.: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Jadna Rocha de Amorim Marques Crea: MG 134.177/D

Red - 0.1mm	Cyan - 0.4mm	White - 0.25mm
Yellow - 0.2mm	Blue - 0.5mm	140 - 0.2mm
Green - 0.3mm	Magenta - 0.6mm	090 - 0.3mm

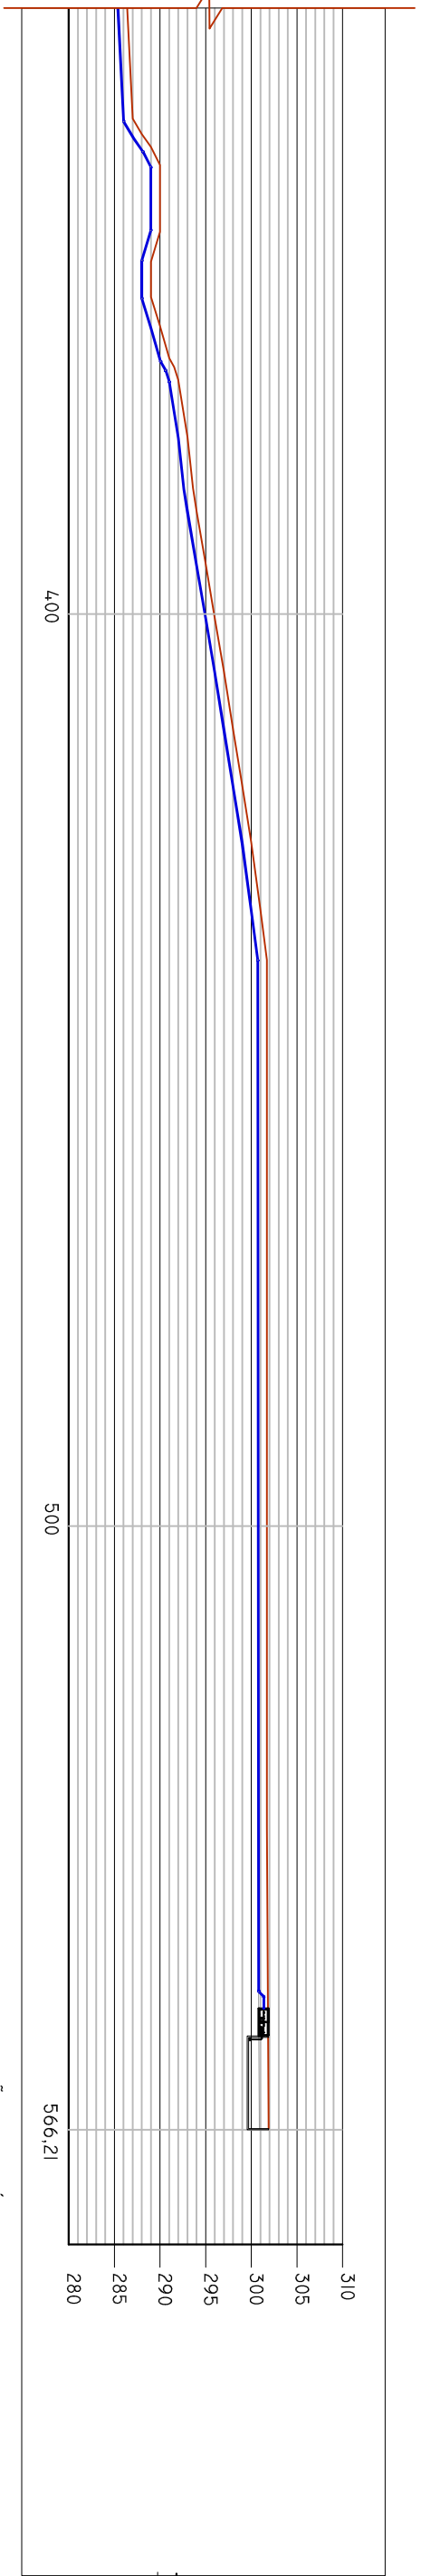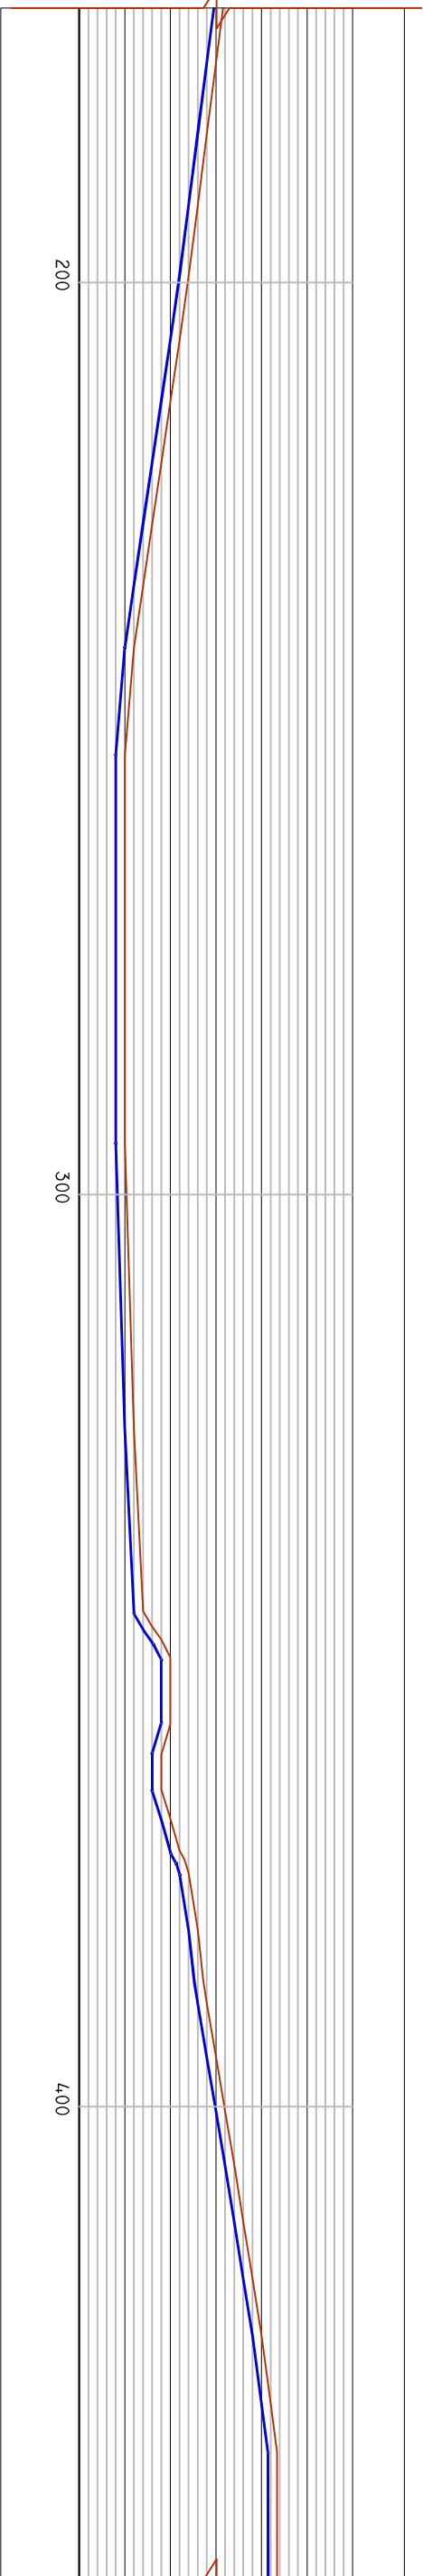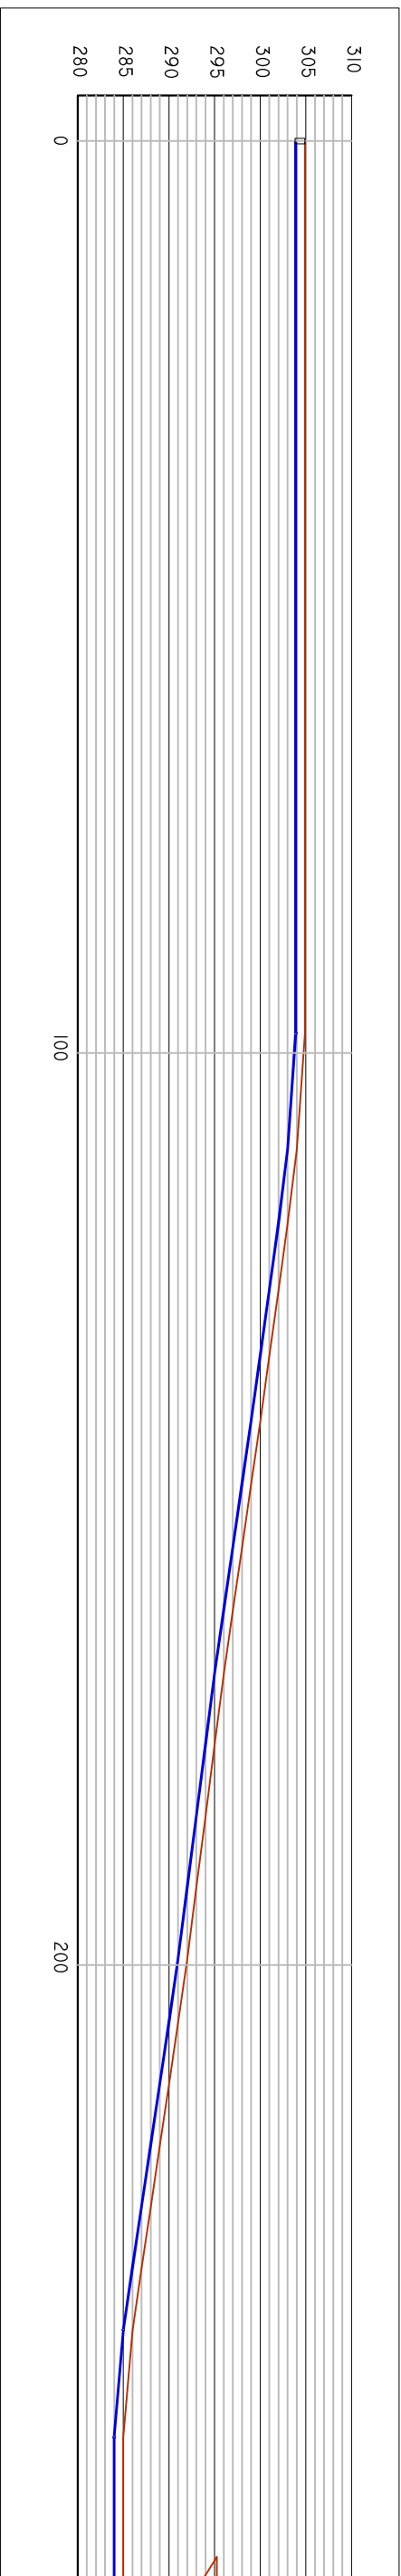

PERFIL TUBULAÇÃO ELEVATÓRIA
ESC: 1:750


ESC: 1:750

ESC: 1:750

[illegible]

White - 0.25mm	Cyan - 0.4mm	Red - 0.1mm
140 - 0.2mm	Blue - 0.5mm	Yellow - 0.2mm
090 - 0.3mm	Magenta - 0.6mm	Green - 0.3mm

PENAS

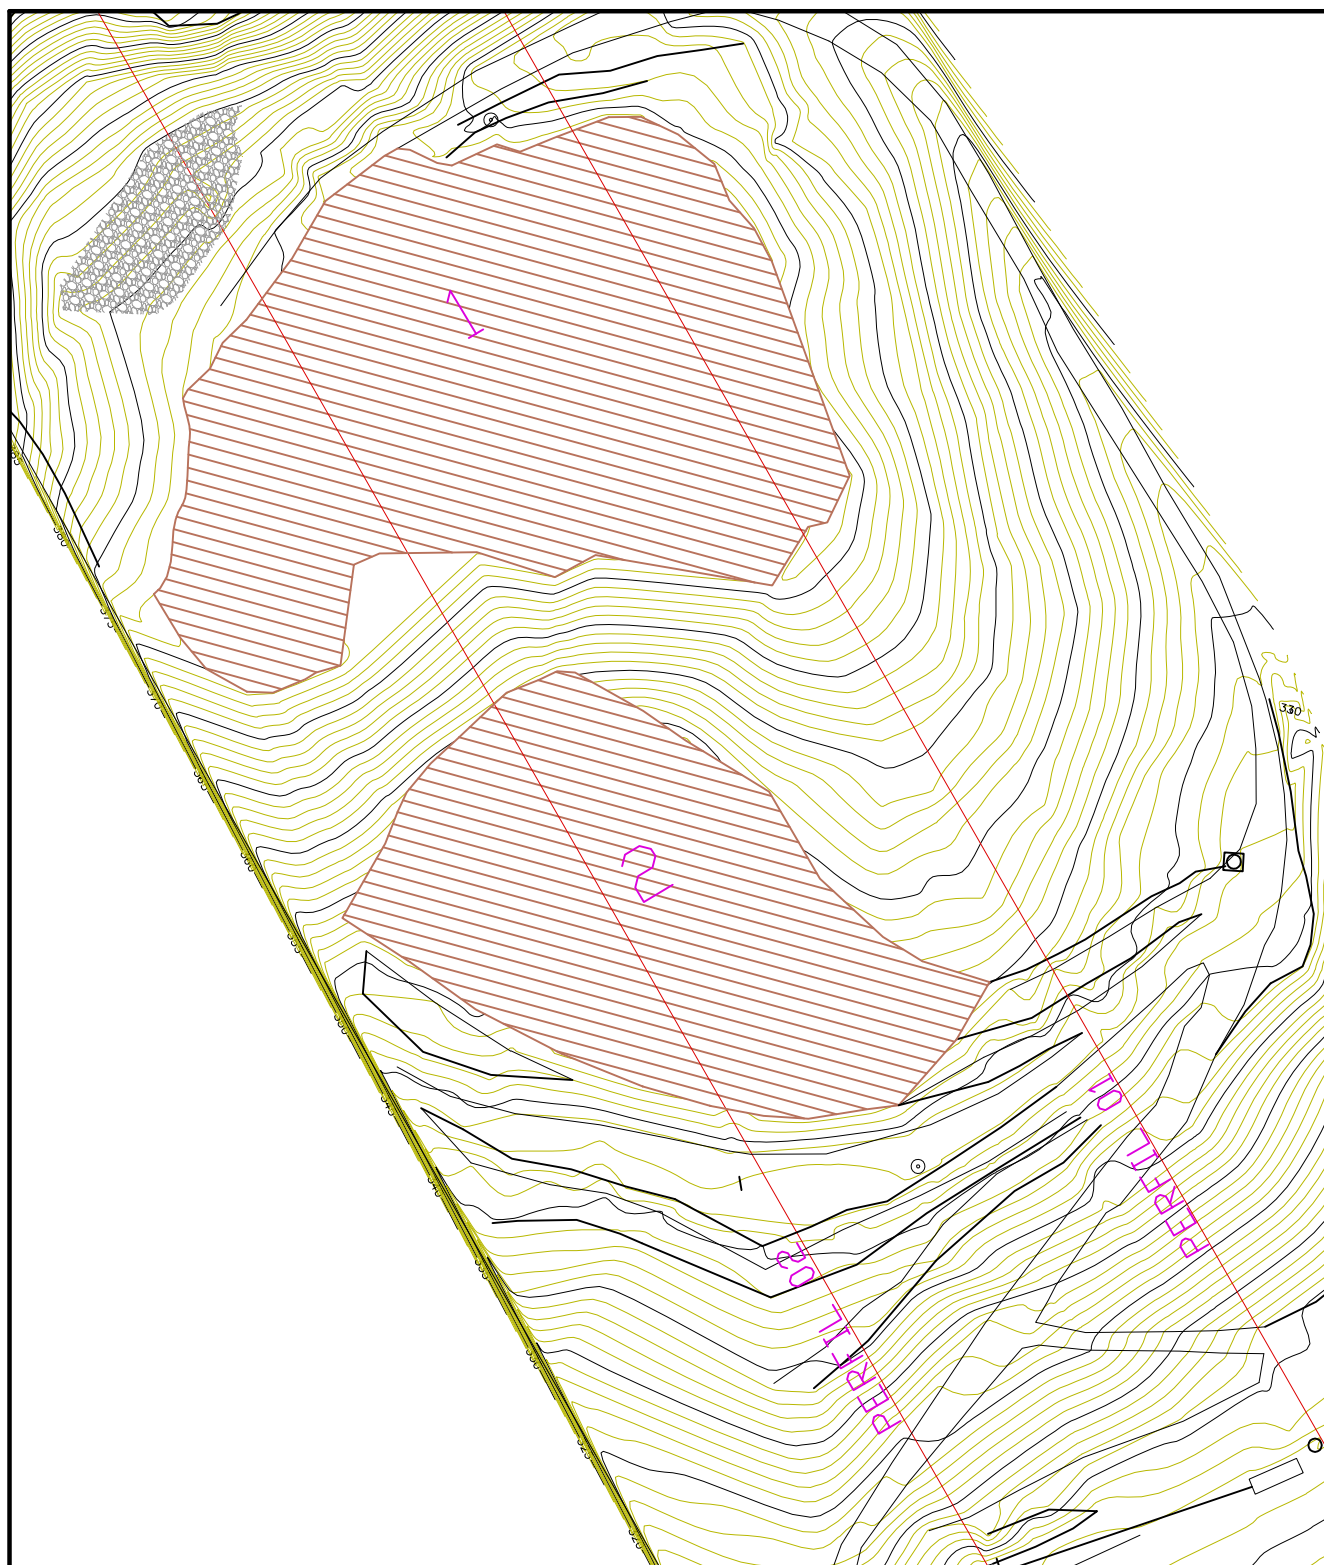

Biokratos
SOLUÇÕES
AMBIENTAIS

A4

www.biokratos.com.br

Tel:(32)3215-9894

Juiz de Fora M.G.

atendimento@biokratos.com.br

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Muriaé

PROJETO/TÍTULO:

Estimativa Volume de Lixo
Seção Perfis

ESCALA:

1/1500

DESENHO:

PPM-Seção Perfis 01-BBA

DATA:

MARÇO-2014

Nº DESENHO

01/02

Nº REVISÃO:

R0

ASS. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Jadna Rocha de Amorim Marques Crea: MG 134.177/D

NOME ARQUIVO:

PPM-Estimativa Volume de Lixo-Perfil Estimativa de Lixo.DWG

PROIBIDA REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA

Março

2014



Biokratos
SOLUÇÕES
AMBIENTAIS

Estação Elevatória – DEMSUR

Memorial Descritivo e de Cálculo da Estação
Elevatória
Memorial Quantitativo
Memorial de Cotações

SUMÁRIO

INFORMAÇÕES GERAIS	4
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	4
EQUIPE TÉCNICA.....	4
NORMAS TÉCNICAS	5
MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CÁLCULO	5
1. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO	5
1.1 Sistema de recalque	5
1.2 Composição físico-química do efluente.....	5
1.3 Impacto ambiental causado pelo chorume	6
2. MEMORIAL DE CÁLCULO	7
2.1 Dimensionamento do sistema	7
MEMORIAL QUANTITATIVO	8
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA.....	8
1 RESERVATÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CHORUME	8
2 REDE DE RECALQUE	8
3 EQUIPAMENTOS	10
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.....	10
5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	12
MEMORIAL DE COTAÇÕES.....	14
1 CONJUNTO MOTOBOMBA AUTOASPIRANTE BCA-41-3 CV, TRIFÁSICO ...	14
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS.....	18
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	19

INTRODUÇÃO

Este trabalho visa projetar uma Estação Elevatória para o atual Aterro Controlado do município de Muriaé/MG.

Para tal, definimos o melhor traçado para a rede saindo do tanque de acumulação de chorume existente, até o sistema de tratamento de efluentes construído no novo aterro sanitário localizado ao lado do atual que será encerrado. Tal medida está voltada para os diferentes problemas que envolvem a utilização dos recursos hídricos, preservação do meio ambiente e saúde pública.

Para esta Estação Elevatória, buscou-se a solução mais viável em termos de técnicas de engenharia e sanitarismo, a fim de conciliar medidas que não só viabilizem financeiramente o projeto em questão, mas que também ofereçam à população melhoria em sua qualidade de vida, como conforto, bem estar e saúde.

Sendo assim, o objetivo principal do tratamento dos efluentes é transformar a matéria orgânica poluidora em subprodutos, de forma que o líquido lançado no corpo receptor atenda aos padrões da Legislação vigente, contribuindo para a redução da poluição ambiental e melhoria do bem estar da comunidade em geral, além da proteção dos recursos hídricos, preservação do meio ambiente e saúde pública.

INFORMAÇÕES GERAIS

Empreendedor: Departamento Municipal de Saneamento Urbano – Limpeza Urbana
Empreendimento: Estação Elevatória

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

Jadna Rocha de Amorim Marques
CREA 134.177/D – MG
Engenheira Civil pela UFJF, Coordenadora de Projetos / RT Engenharia

EQUIPE TÉCNICA

José Mário de Oliveira
Sócio Diretor / Diretor de Projetos da Biokratos Soluções Ambientais

Jadna Rocha de Amorim
Engenheira Civil / Coordenadora de Projetos / RT Engenharia

Bruno Martins Lima
Geógrafo / Assistente de Projetos / RT Licenciamento

Maurício Carrara de Araújo Neto
Biólogo / Coordenador de Projetos / RT Licenciamento

Kátia Cristina Silva
Bióloga / Supervisora de Projetos Licenciamento

Beatriz Barbosa Albertoni
Graduanda em Engenharia Civil / Estagiária Engenharia

Bruno Cândido
Tecnólogo em Gestão Ambiental / Supervisor Operacional

Fernanda Fontebassi
Graduanda em Geografia / Estagiária Licenciamento

Luiza Cortat
Bióloga / Assistente de Projetos Educação Ambiental

Pércio de Castro Pedra
Graduando em Engenharia Civil, Técnico em Edificações / Auxiliar Técnico Engenharia

NORMAS TÉCNICAS

ABNT NBR 9648:1986 - Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário - Procedimento

ABNT NBR 15495:2007 – Poços de monitoramento de águas subterrâneas em aquíferos granulares – Parte 1: Projeto e construção

COPAM - Deliberação Normativa 10/86 - Estabelece normas e padrões para qualidade das águas, lançamento de efluentes nas coleções de águas, e dá outras providências

Resolução CONAMA nº 357:2005 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.

MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CÁLCULO

1. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

1.1 Sistema de recalque

As elevatórias foram projetadas alinhando a flexibilidade operacional com a segurança da automação, de modo a garantir um sistema de recalque de efluentes confiável e econômico.

A automatização permite o funcionamento dos equipamentos frente às variações de vazão afluente, sem demandar qualquer ação direta do operador, liberando-o para outras atividades que necessitam da sua atenção. A atuação das equipes sobre estes equipamentos passa então a estar limitada às intervenções de manutenção preventiva ou corretiva.

Além disso, a adoção desta concepção das elevatórias possibilitam a uniformização de procedimentos operacionais e a padronização dos equipamentos utilizados, com vantagens significativas para a prestadora do serviço em relação ao domínio da tecnologia empregada e a formação de estoques de peças de reposição.

1.2 Composição físico-química do efluente

Diversos fatores contribuem para que o resíduo da decomposição do lixo (chorume) seja complexo e apresente significativas variações em sua composição. Dentre as mais importantes temos: dinâmica de decomposição ao longo do tempo, variações na forma de operação do aterro sanitário, na composição dos resíduos depositados, no volume de chuvas e outras alterações climáticas.

Estudos realizados, com amostras de chorume provenientes de diferentes aterros sanitários, demonstraram diferenças significativas em suas composições. Em geral, o chorume pode ser caracterizado como uma solução aquosa contendo:

Tabela 1: Composição de chorume em aterros sanitários

Parâmetro	Faixa
pH	4,5 – 9
Sólidos totais	2000 – 60 000
Matéria orgânica (mg/L)	
Carbono orgânico total	30 – 29 000
Demanda biológica de oxigênio (DBO₅)	20 – 57 000
Demanda química de oxigênio (DQO)	140 – 152 000
DBO₅/DQO	0,02 - 0,80
Nitrogênio orgânico	14 – 2500
Macrocomponentes inorgânicos(mg/L)	
Fósforo total	0,1 – 23
Cloretos	150 - 4500
Sulfatos	8-7750
HCO₃⁻	610-7320
Sódio	70-7700
Potássio	50-3700
Nitrogênio amoniacal	50-2200
Cálcio	10-7200
Magnésio	30-15 000
Ferro	3-5500
Manganês	0,03-1400
Sílica	4-70
Elementos traços inorgânicos (mg/L)	
Arsênico	0,01-1
Cádmio	0,0001-0,4
Cromo	0,02-1,5
Cobalto	0,005-1,5
Cobre	0,005-10
Chumbo	0,001-5
Mercúrio	0,00005-0,16

Fonte: UFPR, 2014.

1.3 Impacto ambiental causado pelo chorume

O chorume é um líquido escuro contendo alta carga poluidora, o que pode ocasionar diversos efeitos sobre o meio ambiente. O potencial de impacto deste efluente está

relacionado com a alta concentração de matéria orgânica, reduzida biodegradabilidade, presença de metais pesados e de substâncias recalcitrantes.

A decomposição dos resíduos sólidos, depositados em aterros sanitários, é um processo dinâmico comandado por organismos decompositores de matéria orgânica, sendo em sua maioria bactérias heterotróficas, aeróbias e facultativas. Esta decomposição pode ser descrita pelas fases aeróbia e anaeróbia.

A fase aeróbia ocorre durante o primeiro mês de deposição e recobrimento do lixo na vala. A ação de decomposição é realizada pelas bactérias aeróbias que utilizam o oxigênio presente no interior do aterro. É mais intensa no início e a medida que o oxigênio vai ficando escasso a decomposição torna-se mais lenta. A presença de águas pluviais exerce grande influência sobre esta fase, pois facilita a redistribuição de nutrientes e microorganismos ao longo do aterro sanitário.

Quando todo o oxigênio é consumido, inicia-se a fase anaeróbia, onde a decomposição ocorre através dos organismos anaeróbios e/ou facultativos que hidrolisam e fermentam celulose e outros materiais presentes no resíduo. Esta fase é caracterizada pela redução da concentração de carbono orgânico, altos níveis de amônia e largo espectro de metais, representando considerável potencial de risco para o meio ambiente. A fase anaeróbia pode demorar vários anos para estar completa.

Neste sentido, a contaminação do solo é a principal causa de deterioração das águas subterrâneas (BOSCOV, 1997). Os processos de contaminação no solo ocorrem lentamente e, sem consequências imediatas, porém, em longo prazo, podem ter efeitos sérios e, até mesmo irreversíveis. Caso não seja tratado, ele pode atingir lençóis freáticos, rios e córregos, levando a contaminação para estes recursos hídricos. Neste caso, os peixes podem ser contaminados e, caso a água seja usada na irrigação agrícola, a contaminação pode chegar aos alimentos (frutas, verduras, legumes, etc).

2. MEMORIAL DE CÁLCULO

2.1 Dimensionamento do sistema

Elevatória	N.º de bombas	Vazão (m³/h)	Altura manométrica total (m)	Potência (CV)
EE	1 + 1	5,40	6,40	3,00

Vazão máxima de chorume = 1,5 L/s (ver memorial de recuperação do aterro)

Comprimento da linha de recalque: 566,22 m

Diâmetro da linha de recalque: DP = 100 mm

Perda de carga na linha principal: $h_{fp} = 0,07$ mca

Diferença de nível da linha principal: DN = 6,08 m

MEMORIAL QUANTITATIVO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

1 RESERVATÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CHORUME

1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - CÓDIGO 73616 SINAPI

Quantidade = 2,40 m³

1.2 REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO - CÓDIGO 85387 SINAPI

Quantidade = 3,12 m³

1.3 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA - CÓDIGO 83742 SINAPI

Quantidade = 78,56 m³

1.4 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA - CÓDIGO 73907/003 SINAPI

Quantidade = 24,00 m²

2 REDE DE RECALQUE

2.1 ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO - CÓDIGO 3061 SINAPI

Quantidade = 283,11 m³

2.2 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO - CÓDIGO 72920 SINAPI

Quantidade = 265,32 m³

2.3 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 JE 1 MPA DN 100MM - CÓDIGO 00009825 SINAPI

Quantidade = 566,22 m

2.4 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO. - CÓDIGO 73840/001 SINAPI

Quantidade = 566,22 m

- 2.5 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. - CÓDIGO 73963/002 SINAPI**

Quantidade = 1 un

- 2.6 CRIVO FOFO FLANGE, PN-10, DN = 100 MM - CÓDIGO 1646 SINAPI**

Quantidade = 2 un

- 2.7 CURVA DE FERRO FUNDIDO, 90°, FF, PN-10, DIAMETRO NOMINAL DE 100MM - CÓDIGO MAT044600 SCO RIO**

Quantidade = 5 un

- 2.8 CURVA DE FERRO FUNDIDO, 45°, FF, PN-10, DIAMETRO NOMINAL DE 100MM - CÓDIGO MAT044250 SCO RIO**

Quantidade = 5 un

- 2.9 CURVA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, 22° 30', FF, PN-25, DIAMETRO NOMINAL DE 100mm - CÓDIGO MAT044178 SCO RIO**

Quantidade = 3 un

- 2.10 FLANGE DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, CLASSE PN-10, DIAMETRO NOMINAL DE 100MM - CÓDIGO MAT061250**

Quantidade = 10 un

- 2.11 JUNTA GIBALT FOFO DN 100 - CÓDIGO 00003720 SINAPI**

Quantidade = 2 un

- 2.12 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, EM BRONZE, DIAMETRO NOMINAL DE 4" - CÓDIGO MAT119950 127550 SCO RIO**

Quantidade = 2 un

- 2.13 JUNÇÃO DE FERRO FUNDIDO, 45°, FFF, PN-10, DIAMETRO NOMINAL DE (100x100)MM - CÓDIGO MAT074750 SCO RIO**

Quantidade = 1 un

- 2.14 ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FOFO JE DN 100 / DE 110MM - CÓDIGO 00000051 SINAPI**

Quantidade = 1 un

2.15 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM BRONZE, DIAMETRO NOMINAL DE 4" - CÓDIGO MAT150150 127550 SCO RIO

Quantidade = 2 un

3 EQUIPAMENTOS

3.1 MOTOBOMBA BCA-41 3CV TRIFÁSICO - COTAÇÃO

Quantidade = 2 un

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.1 PADRAO POLIFASICO COMPLETO EM POSTE GALV DE 3" X 5,0M - CÓDIGO 00013597 SINAPI

Quantidade = 1 un

4.2 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 3,0 CV, RECALQUE - CÓDIGO ELE-QUA-060 SETOP

Quantidade = 1 un

4.3 CHAVE DE AUTOMATIZAÇÃO PARA DOIS MOTORES, 3,0 CV - COTAÇÃO

Quantidade = 1 un

4.4 DISJUNTOR MONOFASICO 10A, 2KA (220V) - CÓDIGO 00020008 SINAPI

Quantidade = 1 un

4.5 DISJUNTOR MONOFASICO 15A, 2KA (220V) - CÓDIGO 00020009 SINAPI

Quantidade = 2 un

4.6 TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV - CÓDIGO 00007529 SINAPI

Quantidade = 2 un

4.7 TOMADA EMBUTIR 3P 20A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV - CÓDIGO 00007531 SINAPI

Quantidade = 1 un

4.8 AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V - CÓDIGO 00012332 SINAPI

Quantidade = 1 un

4.9 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - CÓDIGO 00007588 SINAPI

Quantidade = 1 un

4.10 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV - CÓDIGO 00001014 SINAPI

Quantidade = 140,00 m

4.11 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV - CÓDIGO 00001013 SINAPI

Quantidade = 1,00 m

4.12 ELETRICISTA - CÓDIGO 00002436 SINAPI

Quantidade = 40,00 horas

4.13 AUXILIAR DE ELETRICISTA - CÓDIGO 00000247 SINAPI

Quantidade = 40,00 horas

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1 Catálogo BCA-41



Bombas Autoaspirantes
Séries BCA-41 e BCA-42

Bombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela.

Aplicações Gerais

- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Rebocamento de lençol freático
- Captação fluvial
- Aquicultura
- Irrigação
- Fertilização orgânica: transporte e aspersão de chorume
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
- Indústrias

Detalhes Técnicos do Produto Padrão

- Bocais flangeados com rosca BSP
- Corpo da bomba de ferro fundido GG-20
- Intermediário de ferro fundido GG-15
- Rotor semi-aberto de ferro fundido GG-20
- Placa de fundo de ferro fundido GG-20
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N e carbetto de silício
- Motor elétrico IP-55, 2 Pólos, 60 Hz

Opções

- Bocais flangeados: rosca NPT
- Corpo da bomba: ferro fundido nodular
- Intermediário: ferro fundido nodular
- Rotor: bronze, ferro fundido nodular
- Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbetto de silício, Viton® carbetto de silício, outros sob consulta
- Motor elétrico IPW-55, alto rendimento, à prova de explosão
- Mancalizada



Importante


- Consulte a Fábrica sobre limite de autoaspiração para líquidos com peso específico superior a 1 g/cm³.
- Para bombeamento de chorume, siga as orientações contidas no Manual de Instrução.
- Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
- Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de EPDM ou Viton®.

Modelo	Potência (cv)	Manômetro	Tritador	Ø Sucção (pol)	Ø Resaque (pol)	Pressão máxima vazão (m c.a.)	Altura máxima de autoaspiração (m c.a.)	Ø Máximo dos sólidos (mm)	Ø Rotor (mm)	CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS																		
										Altura Manométrica Total (m c.a.)																		
										5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	28	30	32	33	34	36	38
										Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m c.a.																		
BCA-41	3	x	x	2 1/2	2 1/2	24	6	4	133	39,8	38,5	35,6	32,7	29,7	26,5	23,1	19,5	15,7	11,6									
	4	x	x	2 1/2	2 1/2	26	6	5	136	*	*	38,3	35,5	33,6	30,6	27,4	24,0	20,4	16,4	12,1								
	5	x	x	2 1/2	2 1/2	30	6	5	142	*	*	*	*	41,2	38,2	35,1	31,9	28,5	25,0	21,2	18,3	13,0						
	7,5	x	x	2 1/2	2 1/2	36	6	6	147	*	*	*	*	*	*	*	43,1	38,7	36,2	34,3	28,3	23,9	19,0	16,4				
	10	x	x	2 1/2	2 1/2	40	6	6	150	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44,0	40,0	35,7	33,4	31,0	25,7	19,7	
Modelo	Potência (cv)	Manômetro	Tritador	Ø Sucção (pol)	Ø Resaque (pol)	Pressão máxima vazão (m c.a.)	Altura máxima de autoaspiração (m c.a.)	Ø Máximo dos sólidos (mm)	Ø Rotor (mm)	CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS																		
										Altura Manométrica Total (m c.a.)																		
										28	31	34	36	39	41	43	46	48	50	52	54	56	57	59	63	65	67	69
										Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m c.a.																		
BCA-42	12,5	x	x	3	3	46	6	5	169	52,0	46,6	40,6	36,2	29,6	22,5	15,0												
	15	x	x	3	3	52	6	6	174	*	*	51,3	47,1	40,1	35,0	29,3	19,2											
	20	x	x	3	3	61	6	6	184	*	*	*	*	52,8	46,1	41,3	36,2	30,8	24,9	18,4								
	25	x	x	3	3	67	6	10	191	*	*	*	*	*	*	52,8	46,9	41,8	36,4	33,7	28,1	16,3						
	30	x	x	3	3	73	6	10	195	*	*	*	*	*	*	*	*	54,2	51,7	46,7	38,3	30,9	25,4	19,7				

Obs.: – Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo "A", com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes consulte a Fábrica.
– Não utilize a bomba na faixa com asteriscos (*).
– Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deve de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
– Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.


LG4142 Revisão 00 - Março 2000

Estação Elevatória – DEMSUR

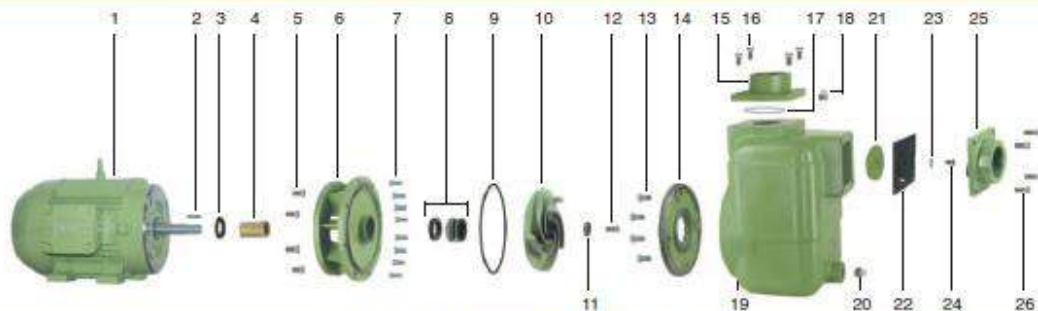

CÓDIGOS DOS COMPONENTES DOS PRODUTOS												
Item	Descrição	Quantidade	BCA-41									
1	Motor elétrico P-55, 2 Pólos, 60 Hz	1	3 cv	4 cv	5 cv	7,5 cv	10 cv	12,5 cv	15 cv	20 cv	25 cv	30 cv
2	Eixo do rotor	1	184-3	184-3	184-3	184-3	184-3	184-3	184-3	184-3	184-3	184-3
3	Anel do mangote	1	401-7	401-7	401-7	401-7	401-7	401-7	401-7	401-7	401-7	401-7
4	Bucha do eixo	1	1852-1	1852-1	1852-1	1852-1	1852-1	1852-1	1852-1	1852-1	1852-1	1852-1
* 5	Parafuso S.N.C.	4	140-5	140-5	140-5	140-5	140-5	140-5	140-5	140-5	140-5	140-5
* 6	Intermediário	1	31132-7	31132-7	31132-7	31132-7	31132-7	31132-7	31132-7	31132-7	31132-7	31132-7
7	Parafuso S.N.C. 3/8" x 1"	8	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6
8	Selo mecânico 1 1/4" 121 CARB. SILICIO BUNA	1	4999-2	4999-2	4999-2	4999-2	4999-2	4999-2	4999-2	4999-2	4999-2	4999-2
9	O-ring	1	879-5	879-5	879-5	879-5	879-5	879-5	879-5	879-5	879-5	879-5
10	Rotor	1	31109-1	31111-0	31113-3	31115-7	31085-2	31046-3	31047-5	31049-7	31049-9	31039-6
11	Arruela de flange do rotor	1	1230-0	1230-0	1230-0	1230-0	1230-0	1230-0	1230-0	1230-0	1230-0	1230-0
12	Parafuso S.N.C. 3/8" x 1" INOX	1	1374-2	1374-2	1374-2	1374-2	1374-2	1374-2	1374-2	1374-2	1374-2	1374-2
13	Parafuso S.N.C.	4	4634-6	4634-6	4634-6	4634-6	4634-6	4634-6	4634-6	4634-6	4634-6	4634-6
14	Placa de fundo	1	31087-6	31087-6	31087-6	31087-6	31087-6	31037-2	31037-2	31037-2	31037-2	31037-2
15	Flange de flange	1	30841-9	30841-9	30841-9	30841-9	30841-9	30811-0	30811-0	30811-0	30811-0	30811-0
16	Parafuso S.N.C. 1/2" x 1"	4	1953-7	1953-7	1953-7	1953-7	1953-7	1953-7	1953-7	1953-7	1953-7	1953-7
17	O-ring	1	2843-5	2843-5	2843-5	2843-5	2843-5	2843-5	2843-5	2843-5	2843-5	2843-5
18	Buola 3/4" GAS	1	393-1	393-1	393-1	393-1	393-1	393-1	393-1	393-1	393-1	393-1
19	Corpo	1	4931-1	4931-1	4931-1	4931-1	4931-1	4931-1	4931-1	4931-1	4931-1	4931-1
20	Buola 1/2" GAS	1	704-3	704-3	704-3	704-3	704-3	704-3	704-3	704-3	704-3	704-3
21	Piso do válvula	1	447-9	447-9	447-9	447-9	447-9	31043-8	31043-8	31043-8	31043-8	31043-8
22	Junta de flange	1	4250-0	4250-0	4250-0	4250-0	4250-0	31044-0	31044-0	31044-0	31044-0	31044-0
23	Arruela fixa INOX	1	3136-7	3136-7	3136-7	3136-7	3136-7	4636-0	4636-0	4636-0	4636-0	4636-0
24	Parafuso S.N.C.	1	2951-8	2951-8	2951-8	2951-8	2951-8	4290-0	4290-0	4290-0	4290-0	4290-0
25	Corpo da válvula	1	30785-3	30785-3	30785-3	30785-3	30785-3	30832-8	30832-8	30832-8	30832-8	30832-8
26	Parafuso S.N.C. 7/16" x 1 1/4"	4	18-8	18-8	18-8	18-8	18-8	18-8	18-8	18-8	18-8	18-8
**	Manual MG 100C149 JM108	1	1135-6	1135-6	1135-6	1135-6	1135-6	1135-6	1135-6	1135-6	1135-6	1135-6
	Diâmetro do rotor (mm)		135	136	142	147	152	163	174	184	191	195

- * Para bombas com motor 7,5 cv Monofásico, substituir item 5 (código 140-5) pelo código 1953-7 e item 6 (código 31132-7) pelo código 31140-6.
 ** Para bombas Monofásicas, item 5, código 140-5 para todas BCA-41 e código 3-6 para todas BCA-42 e código 31132-7 para todas BCA-41 e código 30802-8 para todas BCA-42.

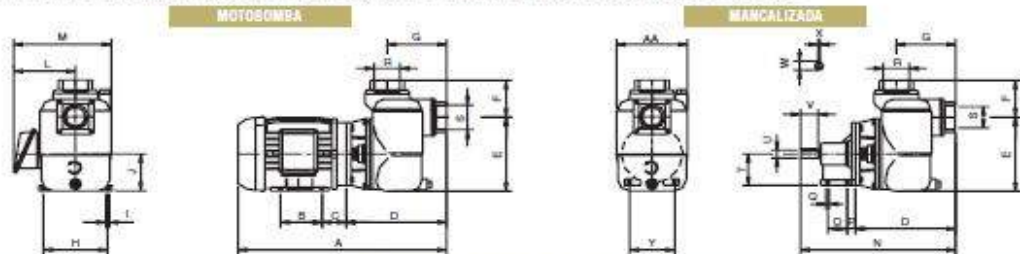

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm) – 60 Hz												
Descrição	BCA-41											
Potência Referencial	3 cv	4 cv	5 cv	7,5 cv	10 cv	12,5 cv	15 cv	20 cv	25 cv	30 cv		
A	579	642	693	842	893	745	893	745	893	745	893	745
B	100	140	125	140	140	140	178	140	178	178	210	254
C	96	83	96	70	83	70	89	89	89	89	108	102
D	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325
E	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
F	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
G	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
H	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
I	10	12	10	12	12	12	12	12	12	12	15	15
J	90	100	90	112	100	112	132	132	132	132	160	160
L	150	167	150	167	160	199	180	199	207	205	252	250
M	251	268	251	268	261	310	291	310	342	340	402	404
N	517	517	517	517	517	517	517	517	530	530	530	530
O	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
P	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Q	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
R (193)	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
S (193)	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
T	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
U	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
V	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
W	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Y	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
AA	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
Peso Motorbomba (kg)	50,0	66,3	53,1	70,0	61,5	74,7	70,4	86,6	94,6	101	118	126
Peso Mancaizola (kg)	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	38,6	38,6	59,0	59,0	59,0	59,0

- Obs.: – As informações hidráulicas, composição e dimensionais podendo sofrer alterações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.
 – A utilização de motores diferentes do padrão de linha alteram as características de desempenho do conjunto.
 – As fotos e desenhos são de caráter ilustrativo.

vendas@schneider.ind.br
 www.schneider.ind.br

Indústrias Schneider S.A.

A Franklin Electric company

MEMORIAL DE COTAÇÕES

1 CONJUNTO MOTOBOMBA AUTOASPIRANTE BCA-41-3 CV, TRIFÁSICO



GIGAWATT
Solução em Automação

GIGAWATT SISTEMAS E MAT ELETROMECANICOS LTDA
RUA ATHANAZIO A. BERNARDES, 848
68200-000 TIJUCAS - SC
Fone: 48 3263-0605 Fax: 48 3263-0605
CNPJ: 05.756.607/0001-02 I.E: 252.547.519
Email: gigawatt@gigawattsistemas.com.br

Page 1 of 1
Consultor: JHONATAN DE SOUZA RACHADEL
E-mail: jhonatan@gigawattsistemas.com.br
Ramal: 14

Cliente: BLOKRATOS SOLUCOES AMBIENTAIS
Endereço: RUA MACHADO SOBRINHO
Cidade: JUIZ DE FORA
Fone: 32 3215 - 9894 Fax: 32

CEP: 36031-100 UF: MG

Contato: PERCIO DE CASTRO PEDRA
Setor:
E-mail: percio.pedra@blokratos.com.br
Fone: (32)3015-4500
Fax:

Nº Orçamento: 118869

Baixa: 6/3/2014 10:11:24 Validade Proposta: 16/3/2014 Frete: 0 DESTINATARIO Cond Pagto: SUJEITO APROVAÇÃO DE CADASTRO OC Cliente:
Equipamento: Marca: Item Estoque: Nr. Box: OS Cliente:

Item	Produto	CL Fiscal	%ICMS	UN	Qtde	VL Unit. (R\$)	%IPI	Total s/IPI	Total c/IPI	Prazo
038990	MOTOBOMBA AUTOASPIRANTE MOD. BCA-41 3CV TRIFÁSICA 220/380V/44	84137080	12,00	PC	1,00	2.367,14	0,00	2.367,14	2.367,14	15 DIAS

Descrição Técnica: MOTOBOMBA AUTOASPIRANTE MOD. BCA-41 3CV TRIFÁSICA 220/380V/440/770V SUCCAO 2 1/2 POLEGADA / RECALQUE 2 1/2 POLEGADA 4MM MAXIMO DE SOLIDOS ROTOR SEMI ABERTO DE FERRO FUNDIDO E SELO MECANICO DE CARBETO DE SILICIO MOTOR WEG 02 POLOS 60HZ IP55

Condições Gerais - Inclui o custo financeiro - Obs.1: Caso ocorram variações de preços nos custos de mão-de-obra e/ou materiais, nos reservamos o direito de reaver novas bases de preços. - Obs.2: Para os trabalhos realizados em regime de horas extras, sábados, domingos e feriados serão acrescidos percentuais conforme legislação vigente. - Obs.3: Caso o orçamento não seja aprovado, será cobrado 40% do valor da revisão (recompra/desmontagem), referente a avaliação técnica. - Obs.4: O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 60 dias, após este período não nos responsabilizamos mais pelos mesmos. - Assinatura: GIGAWATT LTDA - DE ACORDO COM Nossos PROCEDIMENTOS A LIBERAÇÃO DO SERVIÇO SÓ SE DARÁ APÓS O RECEBIMENTO DE CONFIRMAÇÃO VIA E-MAIL PARA: gigawatt@gigawattsistemas.com.br OU FAX (48)3263-0605	Aprovação - Uso Exclusivo Cliente Autorizamos o orçamento acima cotado nas condições expostas Data: ____/____/____ Assinatura/Carimbo	Peso Total (KG): 0,00 Total Produtos (R\$): 2.367,14 Total Serviços (R\$): 0,00 Total (R\$): 2.367,14 Total IPI (R\$): 0,00 Total ISS (R\$): 0,00 Total Proposta (R\$): 2.367,14
---	--	--



Página: 1

São Paulo, 06 de março de 2014

Ilmo. (s) Sr. (s)
PÉRCIO PEDRA
 DEPTO. DE COMPRAS
 BIOKRATOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Proposta Comercial N° 296909

Cumprindo as gratas ordens de V.S.as., temos a satisfação de levar ao vosso conhecimento o presente orçamento, cujo trabalho merecendo vossa aprovação, executaremos com máxima perfeição.

01 - Escopo Geral:

Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SCHNEIDER BCA-41 3 T 60 4V	PC	1,00	2.195,00	2.195,00

frete incluso

FORNECEMOS QUADROS DE COMANDO E PROTEÇÃO PARA MOTORES E BOMBAS. CONSULTE-NOS, FABRICAMOS SOB ENCOMENDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE.

02 - Prazos e Condições:

Prazo de Entrega: 5 a 7 dias úteis
Frete: 1-Emitente
Garantia: Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação ou material aplicado.
Condição de Pagamento: 28 DDI
Validade da Proposta: 5 dias

03 - Preços (em reais):

Total das Peças: R\$ 2.195,00
Total da Mão de Obra: R\$ 0,00
*** Total Geral:** R\$ 2.195,00

(DOIS MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)*****

* Sujeito a requisição sem aviso prévio.

De Acordo:

BIOKRATOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
 Fone: 32-3015-4590/3215-9894 - Fax:
 E-Mail: percio.pedra@biokratos.com.br

Bombashopping(Rex) - Gislaíne
 Fone: (11) 2626-7517 - Fax: (11) 2977-7717
 E-Mail: gislaine@bombashopping.com.br

Estação Elevatória – DEMSUR

		Pag 1/1	
		CNPJ:	01.582.892/0001-49
		I.E.:	148.603.346.112
		Orç n°	053564
Contato Sr(a):	PÉRCIO		
Fone:	(32) 3015-4590	DATA:	05/03/2014
Email:	percio.pedra@biokratos.com.br	Site:	

ITEM	QT.	CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO (em R\$)		PRAZO DE ENTREGA
				UNITÁRIO	TOTAL	
1	1		CONJ. MOTOBOMBA SCHNEIDER MOD. BCA-41 3CV TRIF. 4V	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00	7 DIAS
2					R\$ -	
3					R\$ -	
4					R\$ -	
5					R\$ -	
6					R\$ -	
7					R\$ -	
8					R\$ -	
9					R\$ -	
10					R\$ -	
11					R\$ -	
12					R\$ -	
13					R\$ -	
14					R\$ -	
15					R\$ -	
16					R\$ -	
17					R\$ -	
18					R\$ -	
19					R\$ -	
20					R\$ -	
21					R\$ -	
22					R\$ -	
23					R\$ -	
24					R\$ -	
25					R\$ -	
26					R\$ -	
27					R\$ -	
28					R\$ -	
29					R\$ -	
30					R\$ -	
31					R\$ -	
32					R\$ -	
33					R\$ -	
34					R\$ -	
35					R\$ -	
36					R\$ -	
***** TOTAL *****				R\$	2.370,00	

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28/56 DDL MEDIANTE CADASTRO / OU A COMBINAR

GARANTIA: 12 MESES

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME DESCRITO ACIMA (SALVO ENTREGA FÁBRICA)

FRETE: FOB

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

Atenciosamente, **FILLIPPI GONÇALVES / Setor de Vendas**



Rua Dr. João Alves de Lima, 325A - Brás - São Paulo / SP - Cep: 03052-060 Fone: (011) 2614-0005 (011) 2614-0006

CNPJ: 01.582.892/0001-49 I.E.: 148.603.346.112

e-mail: fillippi@meritocomercial.com.br Site: www.meritocomercial.com.br

SEJA BEM-VINDO A NOSSA EMPRESA!

Estação Elevatória – DEMSUR



Fone: 32 3215-4473 / Fax: 32 3215-4473
AV BRASIL, 7935
36080-060 JUIZ DE FORA MG
CNPJ: 20.327.177/0001-04 Insc.Estadual: 3672669140085
vendas@edilsonelétrica.com.br

Orçamento
00046564OR

JUIZ DE FORA, 10 de março de 2014

PERCIO

Prezado(s) Senhor(es):

Atendendo sua prezada solicitação, vimos cotar-lhe(s) nosso(s) preço(s) para o(s) material(ais) conforme abaixo:

PRODUTO	Quantidade	Preço	Total
CHAVE MAGNETICA ECON 7,5, CV 220V SCHNEIDER	1 UND	268,83	268,83

Valor Total: 268,83 (Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos)
Condição de Pagamento: 15 DIAS
Requisitado por: PERCIO
Validade do Orçamento: 5 dia(s) a contar desta data.

ENTREGA IMEDIATA

Atenciosamente,
RODRIGO GOMES
SETOR DE VENDAS

EDILSON ELETRICA LTDA

Devido ao não recebimento das demais cotações em tempo hábil, indicamos os possíveis fornecedores:

Pecma do Brasil Indústria e Comércio LTDA
CNPJ: 56.575.756/0001-13

Comercial Elétrica Fasorial LTDA
CNPJ: 01.294.497/0001-60

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS

Não se atribuirá responsabilidade técnica a esta equipe no que tange à execução do projeto, assim como o não atendimento por parte da Contratante às normas técnicas que regem este memorial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOSCOV, MARIA EUGENIA GIMENEZ (2008). Geotecnia Ambiental. 1º edição, Ed. Oficina de Textos. São Paulo, 2008.

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Composição de Serviços da CAIXA Econômica Federal referente à localidade Belo Horizonte para o mês de Janeiro, ano de 2014. Disponível em: <http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/sinapi/servicos_semdes_jan_2014/COMPOSI%C7%D5ES_MG_JAN_2014_SEM_DESONERA%C7%C3O_RETIFICA%C7%C3O.pdf> Acesso em 20/02/2014 09:40

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Composição de Insumos da CAIXA Econômica Federal referente à localidade Belo Horizonte para o mês de Janeiro, ano de 2014. Disponível em: <http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/sinapi/insumos_semdes_jan_2014/PRECOS_INSUMOS_MG_JAN_2014_SEM_DESONERA%C7%C3O_RETIFICA%C7%C3O.pdf> Acesso em 20/02/2014 09:40

SETOP - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas. Planilha referencial de preços unitários para obras de edificação e infraestrutura referente à região Leste para o mês de Dezembro, ano de 2013. Disponível em: <http://www.transportes.mg.gov.br/images/documentos/precosetop/preco_setop_leste.pdf> Acesso em 05/03/2014 16:51

Tecnotrater - Grupo de Desenvolvimento de Técnicas Avançadas para o Tratamento de Resíduos. Disponível em <<http://www.quimica.ufpr.br/tecnotrater/chorume.htm>> Acessado em 05/03/2014 as 16:13



Biokratos
SOLUÇÕES
AMBIENTAIS

BIOKRATOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA S/C

CNPJ: 01.414.690/0001-98

RUA MACHADO SOBRINHO, 308 - ALTO DOS PASSOS

JUIZ DE FORA-MG

CEP: 36.026-380

TELEFAX: (32) 3215-9894

ATENDIMENTO@BIOKRATOS.COM.BR

WWW.BIOKRATOS.COM.BR
